

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/11/2020 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: -
ID-label: Woning B.T.W. nr.: Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Geleg
Huisnummer 75
Busnummer
Postcode 2980
Gemeente Zoersel
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Geleg
Huisnummer 75
Busnummer
Postcode 2980
Gemeente Zoersel
Land België

Naam contactpersoon Roel Eekhoud
Telefoon 0472069809
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -
Teller Nr.: : 24 418 782

Type : woning

EAN : 54

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 21 Isolatie: 0,613 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 23 Ω

DIFFERENTIELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		4	-
10	C	16		2	-
8	C	20		2	-
2	C	10		2	-

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
Aansluitingen OK NOK Correcte schema's OK NOK schema in bijlage door Aceg vzw
Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting
Continuïteit OK NOK Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 6/11/2045
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.


- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be



02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/11/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

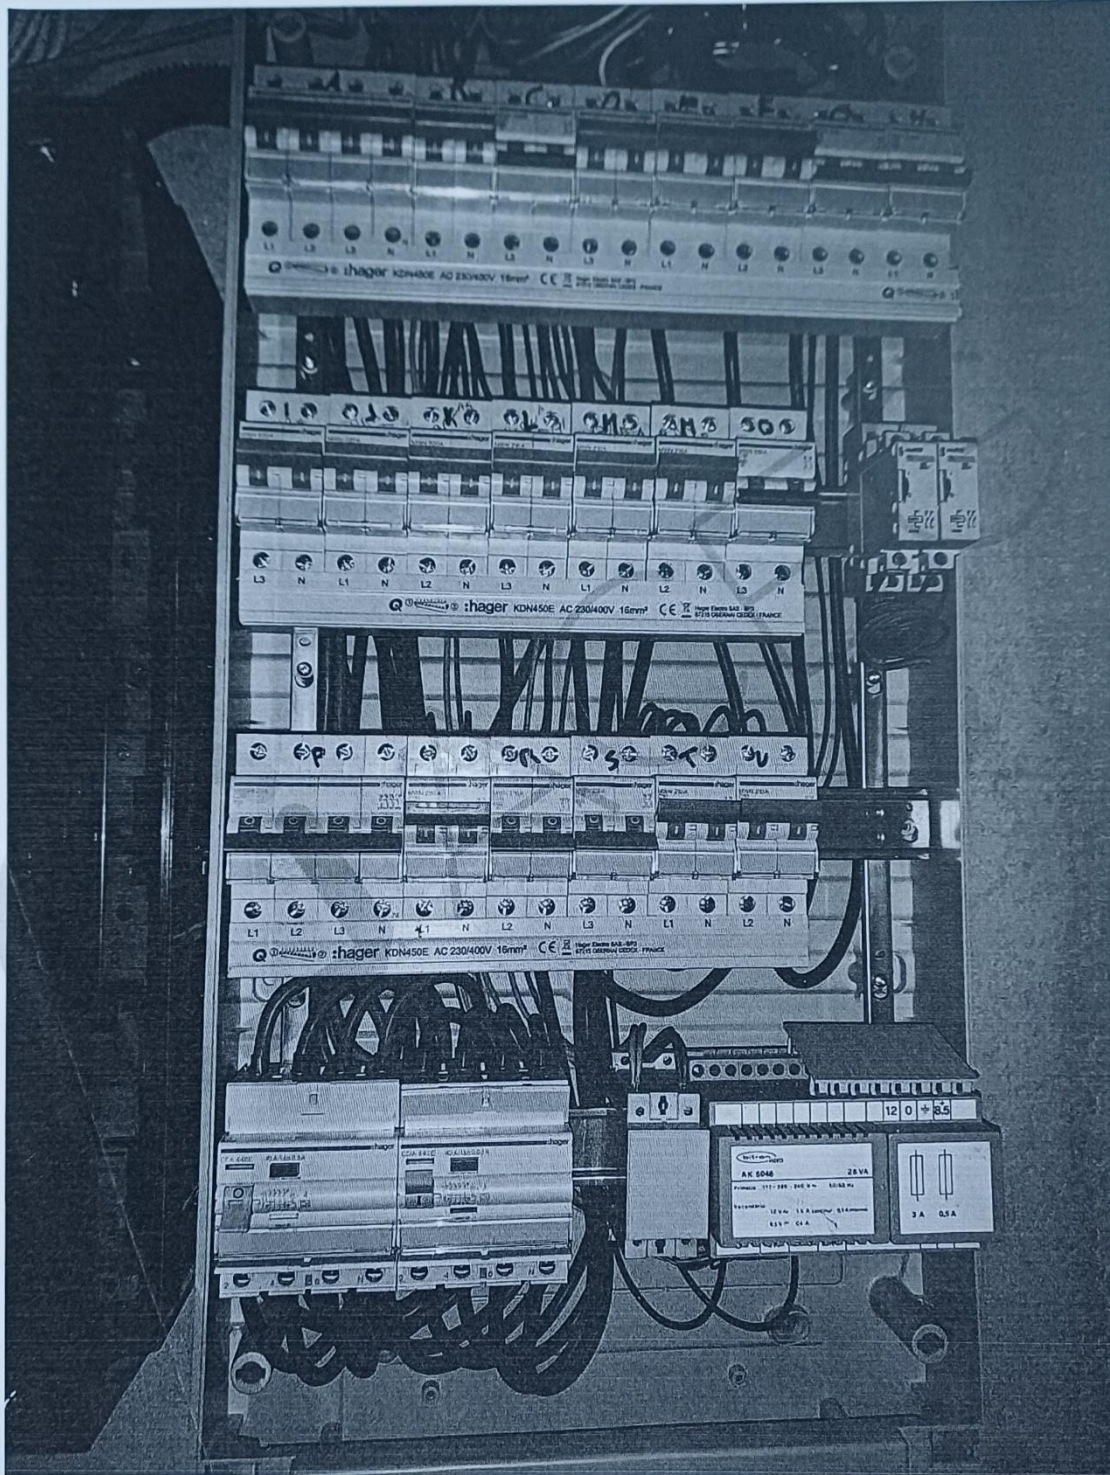

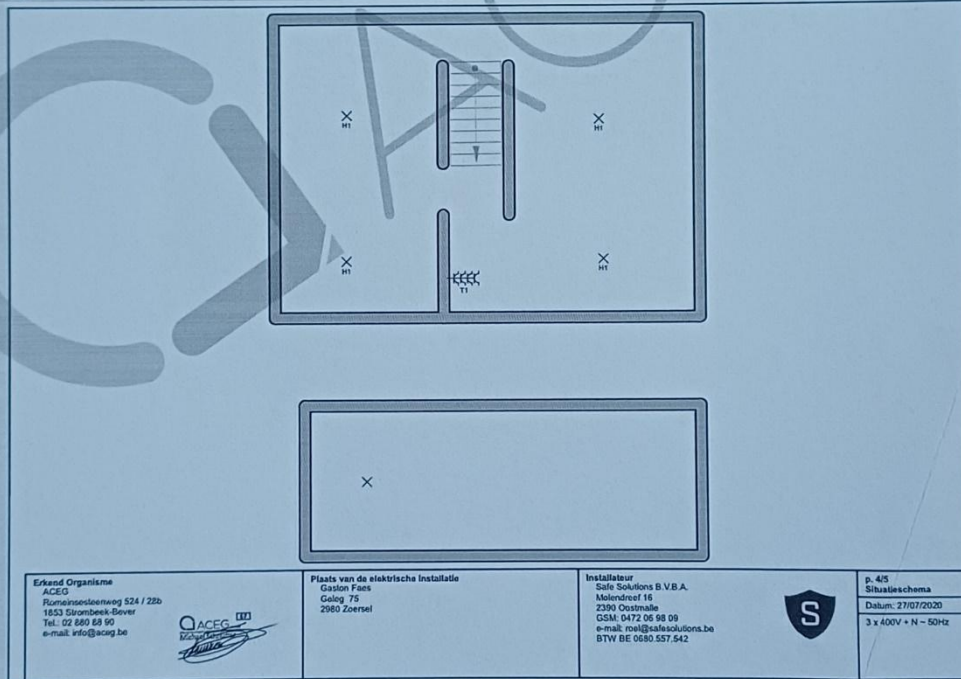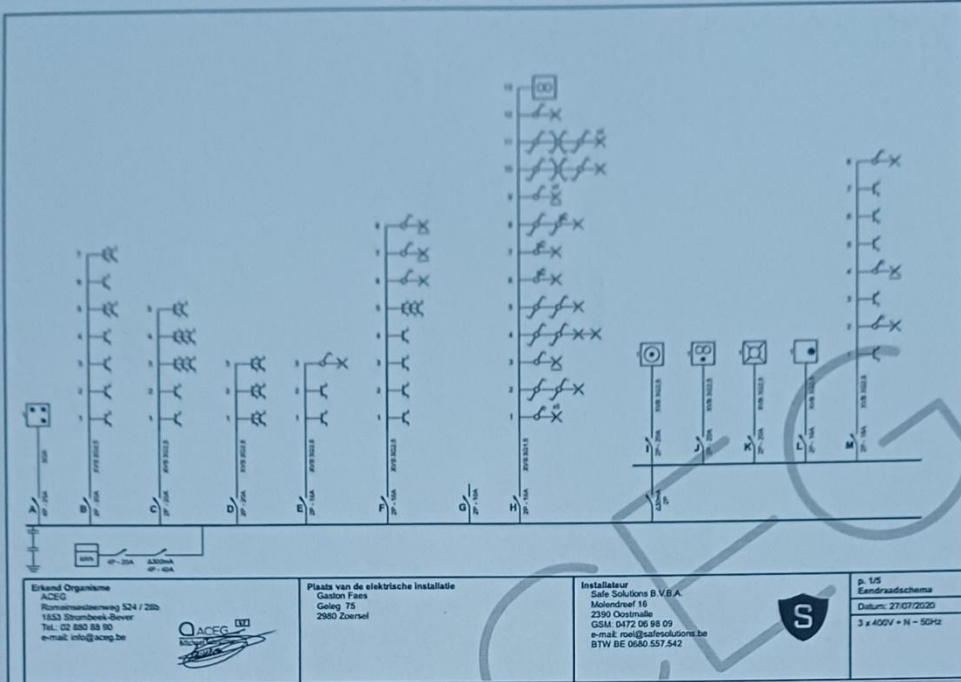

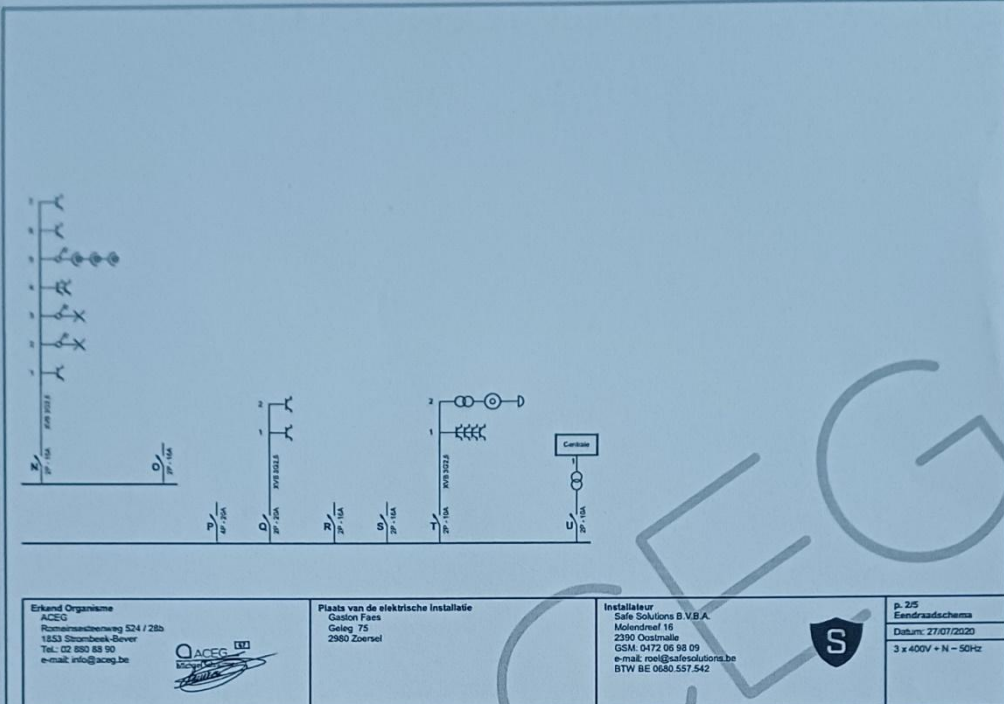

Erkend Organisme
ACEG
Romanssteenweg 524 / 22b
1853 Strömbeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be




Plaats van de elektrische installatie
Gaston Faes
Galgweg 75
2980 Zoersel

Installateur
Safe Solutions B.V.B.A.
Molendriest 16
2390 Oostmalle
GSM: 0472 06 98 09
e-mail: roel@safesolutions.be
BTW BE 0680.557.542



p. 2/5
Eendradingschema
Datum: 27/07/2020
3 x 400V + N - 50Hz

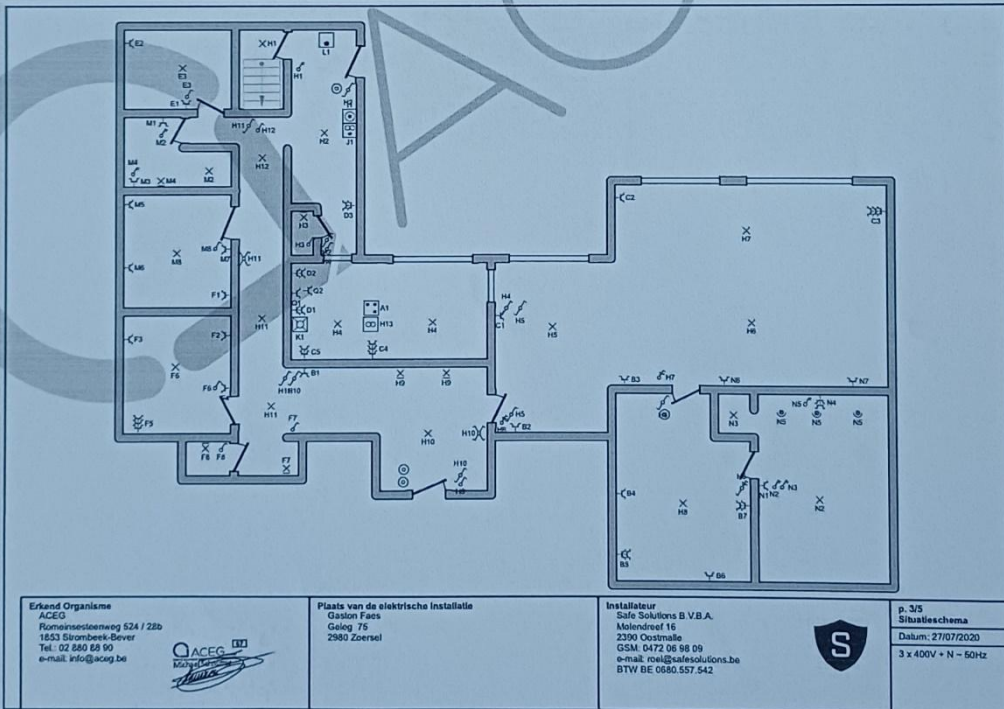

Erkend Organisme
ACEG
Romanssteenweg 524 / 22b
1853 Strömbeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be



Plaats van de elektrische installatie
Gaston Faes
Galgweg 75
2980 Zoersel

Installateur
Safe Solutions B.V.B.A.
Molendriest 16
2390 Oostmalle
GSM: 0472 06 98 09
e-mail: roel@safesolutions.be
BTW BE 0680.557.542



p. 3/5
Situatieschema
Datum: 27/07/2020
3 x 400V + N - 50Hz



