

EAN n° :
N° compteur : 61864466
Index I : 000872, 4 Index II : 0090510
3484125 2015/4/53/204

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /
Complément au rapport n°
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existente / Renforcement / Scission du comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation
Type de locaux : APPARTEMENT 1^{er} étage
Lieu d'inspection : 44 RUE DE BASTOGNE à 4920 NARZE
Propriété de :
Mandant : JJ BURNOTTE
Installateur : JJ BURNOTTE
TVA : 431481041 carte ID : Délivré à : Date :
Inspecteur : TRIBOLET Date d'inspection : 20/4/15

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 N 400 V N Protection max. : 2x 63 A Commutateur; position :
Protection principale : Disj. : 2x 50 A Interrupteur / sectionneur :
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : 4x UB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²
Câble de raccordement au réseau : type de câble : 4x UB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 25 mm²
Réseau aérien / Réseau souterrain / Réseau enterré / Réseau enterré - Fourreau présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente
Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 10 Ω
Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 11 MΩ
Interrupteur différentiel : Général : 2p 63 A 300 mA Supplémentaire : 2p 63 A 30 mA
Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui - non Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre
Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre contact indirect : en ordre - pas en ordre
Continuité PE- et liaison équipotential : en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre
Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation -- appareils


DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

- N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est pas encore raccordée.
- N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est/ ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 20/4/2040 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.
L'installation peut / ne peut pas rester en service
pour assurer la sécurité des personnes et des biens.


Pour le directeur,
l'inspecteur,



43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 1er

SCHEMA UNIFILAIRE

43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 1er

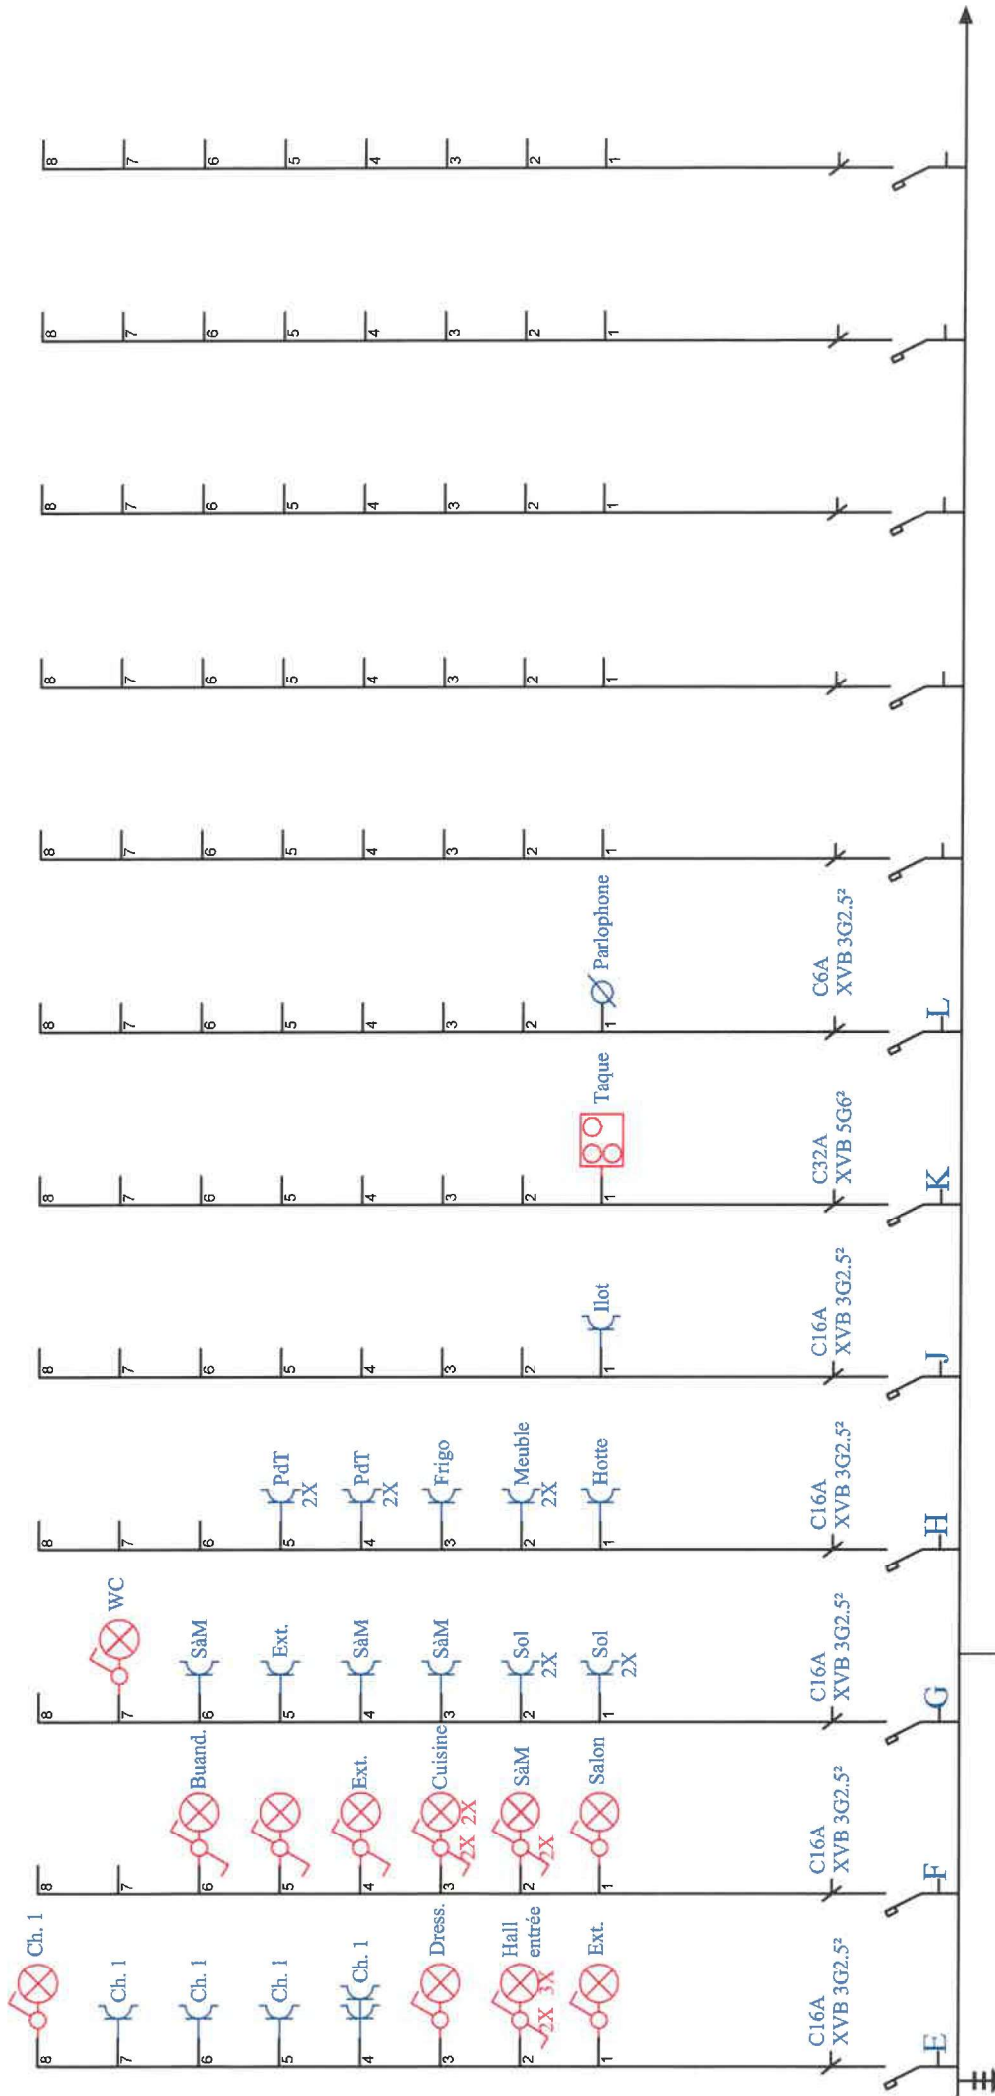

L'installation est contrôlée par:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur : TRIBOLET Jean Paul
Date : 20/11/15
n° PV : 2015141531207
Signature :

J-J BURN TTE

S.A.

SCHÉMA UNIFILAIRE

43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 1er

SdB+
Ch. 2

