

EAN n° :
N° compteur : 61864455
Index I : 0009824 Index II : 0007141
3481201 2015/4/15/208

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /
Complément au rapport n°
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation
Type de locaux : APPARTEMENT 2^e étage
Lieu d'inspection : 43 RUE OLBASTONGE à 4920 HARZE
Propriété de :
Mandant : JJ BURNOTTE
Installateur : JJ BURNOTTE
TVA : 431481041 carte ID : Delivré à : Date :
Inspecteur : TRIBOLET Date d'inspection : 20/4/15

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3-~~400V~~ 3N 400V N Protection max. : 2x 63 A Commutateur; position :
Protection principale : Disj. : 2x 50 A Interrupteur / sectionneur :
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EX 03 nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²
Câble de raccordement au réseau : type de câble : EX 00 nombre de conducteurs : 4 diamètre : 25 mm²
Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourneau, présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente
Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 20 Ω
Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 8 MΩ
Interrupteur différentiel : Général : 2p 63 A 300 mA Supplémentaire : 2p 63 A 30 mA
Fonctionnement bouton d'essai: en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre - pas en ordre
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB. -

Installation exécutée conformément aux schémas: oui - non Etat du matériel électrique: en ordre - pas en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pas en ordre contact indirect: en ordre - pas en ordre
Continuité PE- et liaison équipotential: en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre - pas en ordre
Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

- N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'ont pas sont pas encore raccordées.
N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est pas sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 20/4/2016 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.
L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de
remédier aux infractions constatées et qu'après les mesures nécessaires soient prises
pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur


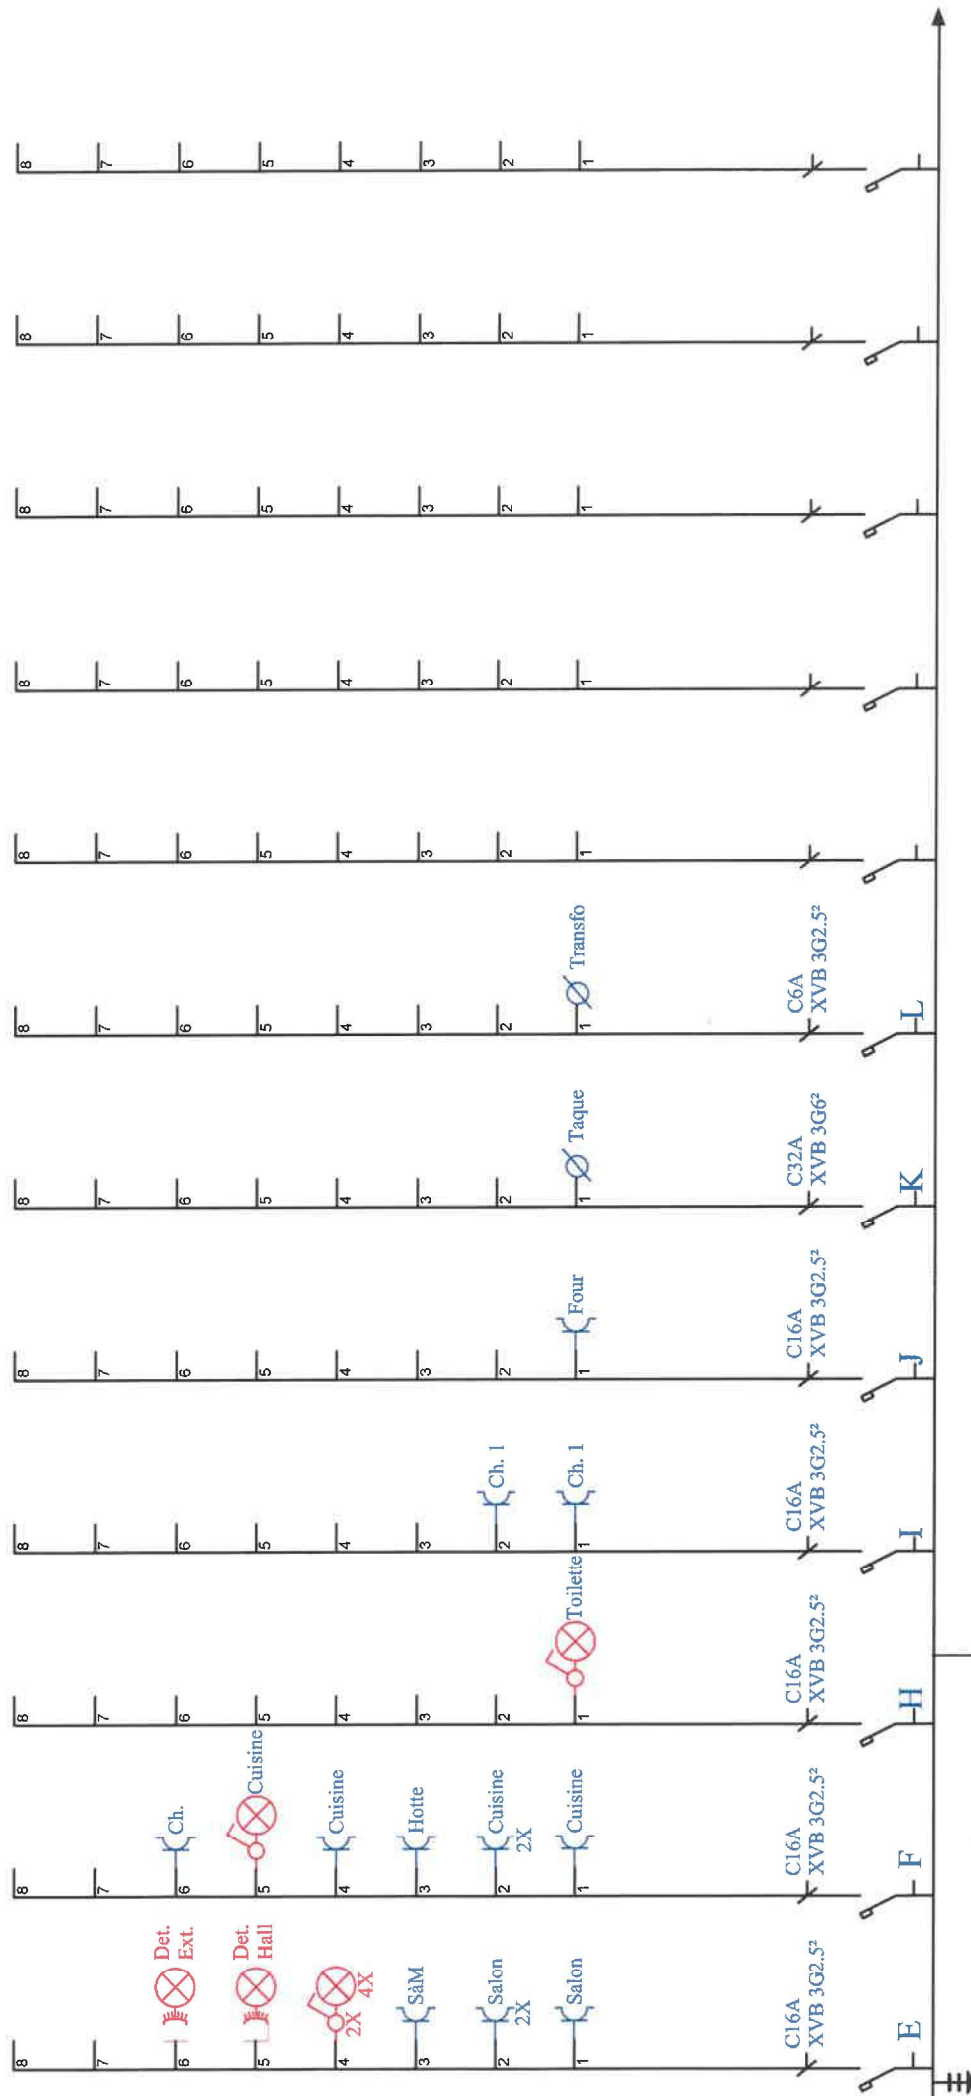

43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 2e

SCHÉMA UNIFILAIRE

43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 2e



L'installation est contrôlée par:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur : TRIBOLET Jean Paul

Date : 20/04/15

n° PV : 2015/4/53/208

Signature : *[Signature]*

J-J BURN  **TTE**

S.A.

SCHÉMA UNIFILAIRE

43, Route de Bastogne
4920 Harzé
Appartement 2e

