

364/120907/09

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : App CO

Plaats van onderzoek : Calabria 2

Eigendom van : [redacted]

Opdrachtgever : Main Technica Kach.comun.eg.12.2.5550 Herenda

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Cardens Datum van onderzoek : 7/9/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40 Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 40 Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : 4XB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 3,66 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 2,9 MΩ

Diff. schak. : algemene : LP 90A 1300 mA bijkomende : LP 90A 130 mA

werking testknop : ~~in orde~~ niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

Zie bijlage de schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Idem

Nota: Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen!

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 7/9/2012, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.


voor de directeur,
de onderzoeker

[Handwritten signature]

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier,
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 nergie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

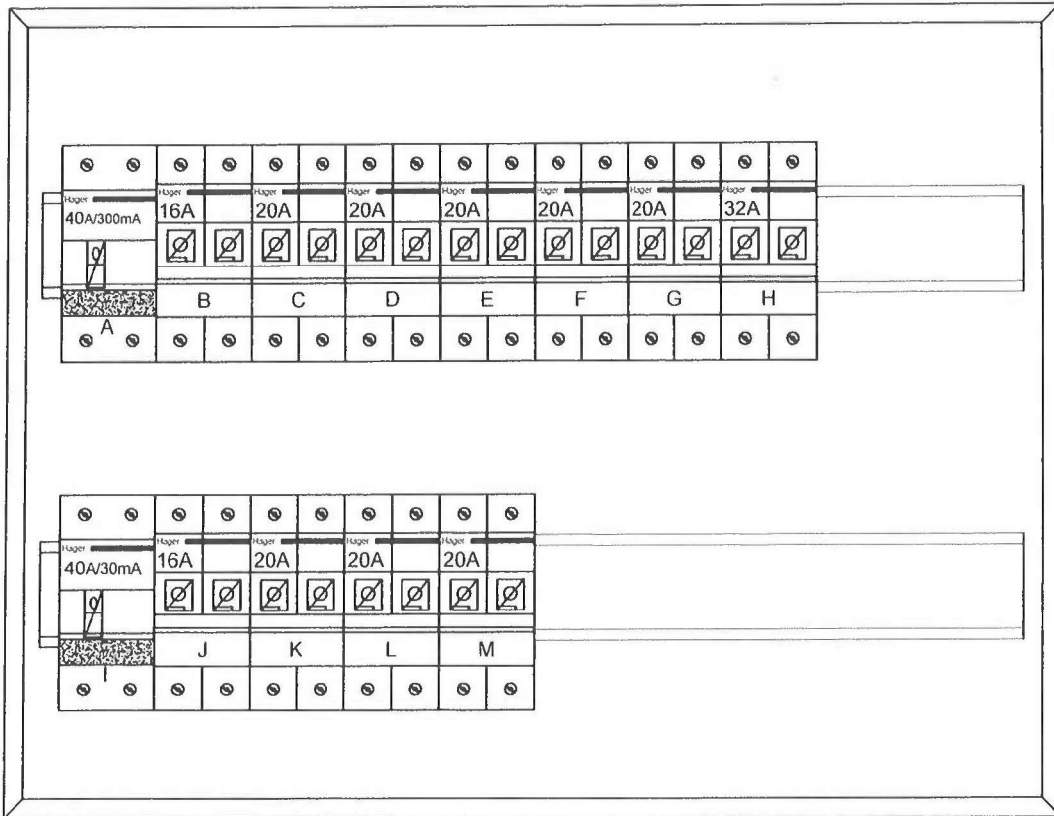

Lochtemanweg 122
 3550 HEUSDEN-ZOLDER
 Tel.: (+32)011/432240
 Fax: (+32)011/436830
 www.marisgroup.eu

Bord 2slaapkamers

Projectnummer : 20111139


Datum : 12.07.2012

Get: RMa

Afgevaardigde erkend
 organisme

Calabria 2

Verantwoordelijke voor de
 uitvoering

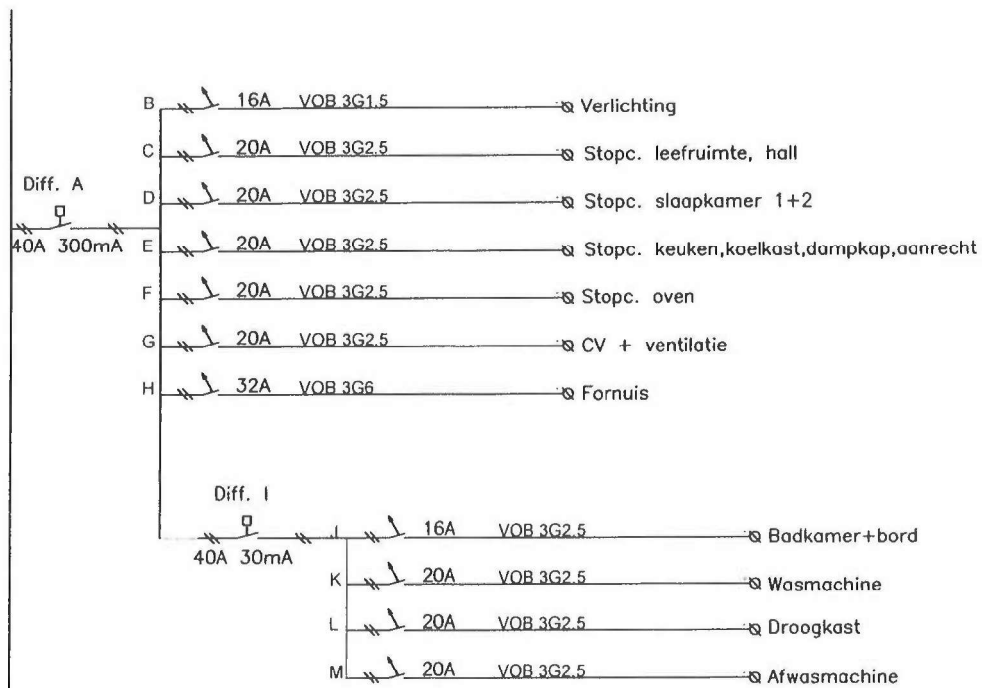

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: (+32)011/432240
Fax: (+32)011/436830
www.marisgroup.eu

Eendraadschema 2slaapkamers

Projectnummer : 20111139

Datum : 12.07.2012

Get: RMa

Afgevaardigde erkend
organisme

Calabria 2

Verantwoordelijke voor de
uitvoering
