

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSESESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL  
T: 011 42 18 34, E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0016-190731-06\_01 Datum van het onderzoek: 31/07/2019  
Extra controledatums:

### ALGEMENE GEGEVENS:


**ADRES INSTALLATIE:** SCHANDORF  
ESSENSTEENWEG 79B  
2930 BRASSCHAAT

**EIGENAAR:** SCHANDORF  
Adres: ESSENSTEENWEG 79B  
2930 BRASSCHAAT

**OPDRACHTGEVER:** ZEEUWS BENNY  
Adres: BEVERLOSESTEENWEG 310  
3583 PAAL

**INSTALLATEUR:** ZEEUWS BENNY  
Adres: BEVERLOSESTEENWEG 310  
3583 PAAL

### Visualisatie van de installatie

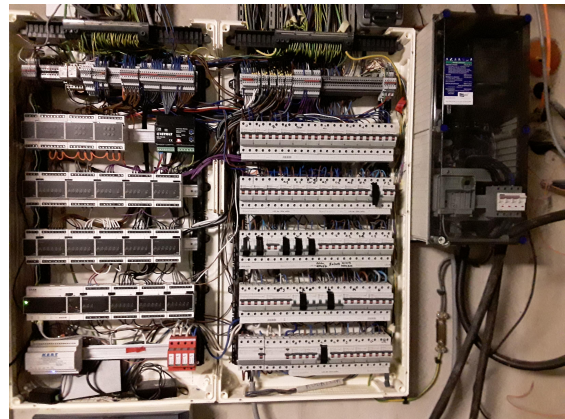

### BTW of IK:

**EAN:** Teller nr. 501932546761 Index:

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Uitbreiding / Wijziging /	Type der lokalen:	Wooneenheid
Begin werken fundering:	Na 01/10/1981	Elektrische installatie:	Na
Aansluiting spanning:	3x400V + N	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	4 x 25	Bescherming van de aansluiting:	32 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type:	4p 63A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombanen:	54
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT



**ONDERZOEK:**

Onderzoek volgens: AREI art. 271  
Aard van het onderzoek: Controlebezoek

**METINGEN:**

RA: 7 Ohm RI tot.: 2 MOhm

**BESCHRIJVING:**

Zie eendraadsschema en situatieschema.

**VASTGESTELDE INBREUKEN:**

Geen

**NOTA'S:**

1 Dit verslag vervangt verslag 0016-190731-06. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

**BESLUIT:** De installatie is conform.  
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31.07.2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0016 ROMAIN REYCKERS

voor De Directeur,



**UITGEVOERDE CONTROLES**

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271):

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 31.07.2044.

STAP 4

BTV Limburg staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

