

Resp. client:
N° commande:
N° client: 16121
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: wch@sotrelco.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5609156/2
N° rapp. prov.:
Date: 19/04/2021

Client / Mandant :

7

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 459
Propriété / exploit./gestionn.: Nom: Adresse: Théophile Massart, 98 à 7020 NIMY
Installat. / respons. travaux: Nom: Adresse: R. T.V.A.: BE0423234655
Adresse installation: Cabine HT - privée: -
Type installation: appartement Appareil/Install. ID: APPARTEMENT 0.2
EAN nr.: Voir schéma Fournisseur: ORES Compteur: A PLACER Compteur nuit:

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4) Dérogat. partie 8 livre 1 *: pas appliqué
(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : -
Date: 17/04/2021 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/04/2046 Date installation: après 01/06/2020
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'isolat.: -
Tension nominal: 1N400V Protection max.: 40A Protection princip.: - Interr. princip.: interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XGB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: - nombre conduct.: - section: - mm²
Electrode de terre: type: boucle section: 35 mm²
Interrupteur Diff.: général: 2p 40A/300mA supplémentaire: 2p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre
Ne sont pas encore placés: ☒ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 16

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >1 MOhm Résistance de dispersion: 8.12 Ohm
Bouton d'essai diff.: p.a. Boucle de défaut: p.a. Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néants
I Néants

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,


0493 24 61 55

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

Numéro EAN : 541449060018867913
 Numéro Compteur :
 Gestionnaire de réseaux : Sibelga
 Protection Compteur : 2 x 40A bihoraire
 Electrode de Terre : Boucle
 Valeur mesurée : 8 Ohms

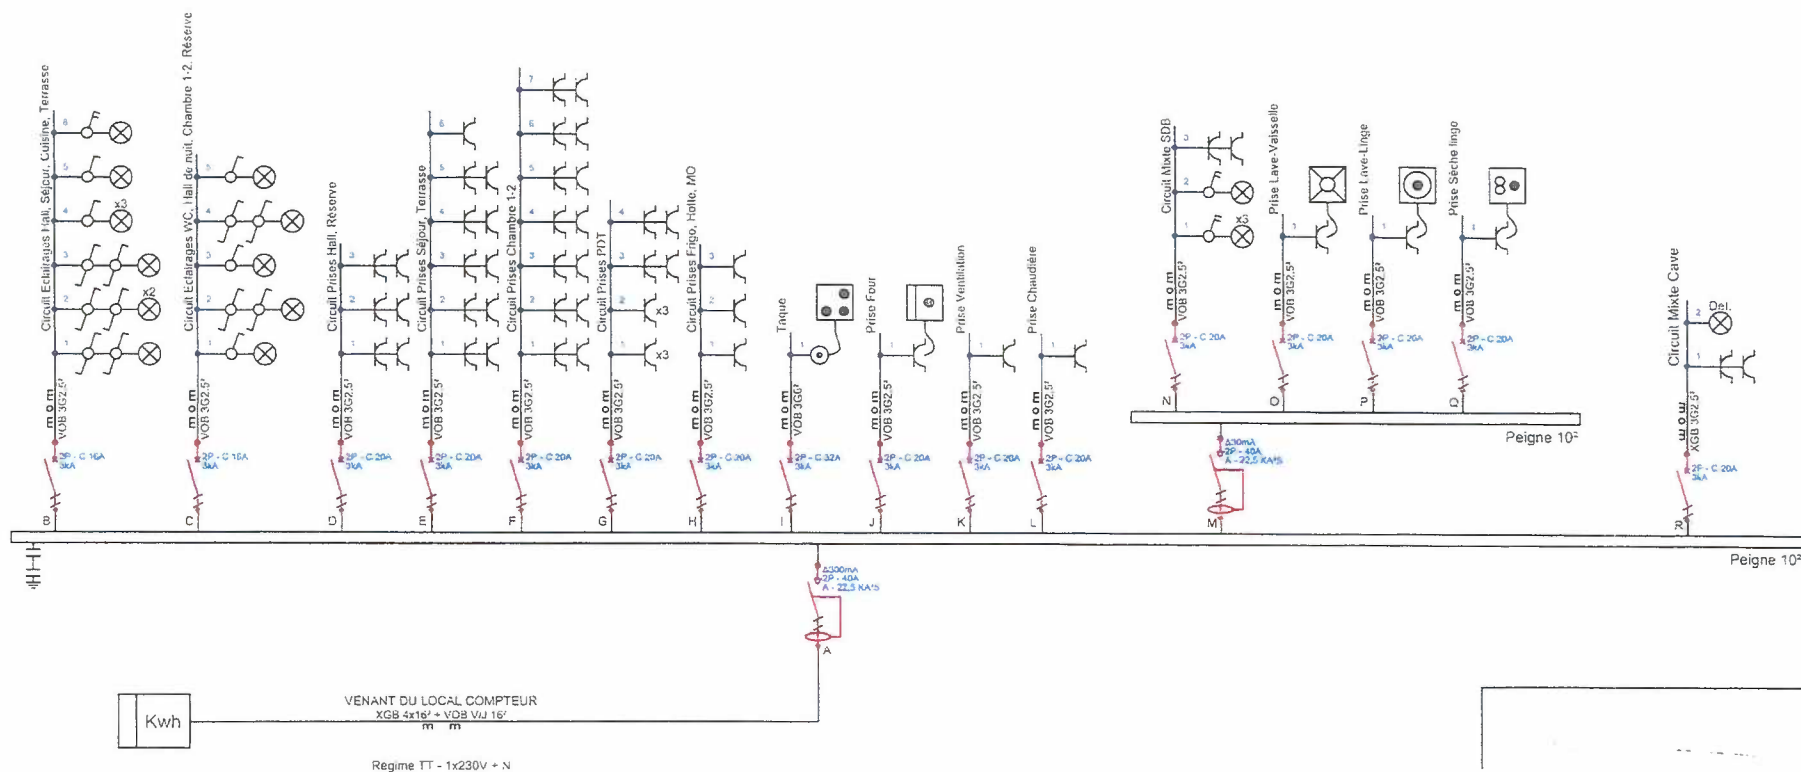

SOTRELCO S.A. - Rue de la Croix du Maître, 1 - 7110 LA LOUVIERE
 BE 0423.234.655 - T: +32 64 22 55 92 - F: +32 64 22 55 48
ELECTRICITE P1 Classe 5 - VENTILATION D18 Classe 7 - SANITAIRE D16 Classe 8 et CHAUFFAGE D17 Classe 7 - CONSTRUCTION D et D1 Classe 7

04		
03		
02	19-04-21	AS BUILT
01	17-09-20	Pour exécution
00	28-02-20	Pour approbation
Ind.	Date	Révision

Organisme de controle

Adresse chantier

PROJET MASSART - App. n°0-2
 Rue Massart n°98, 7020 Nimy

Client

Dessiné
 JCA

Dossier/N°
 EL19109

Date de l'indice
 19-04-2021

Indice
 02

Folio N°
 02/02
