

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: 86/040601/09

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

Bureau régional :
Bxl

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Au Fortin n°8.
1030 Bxl

PROPRIETAIRE : } Okmez Elaik.
Adresse : _____

DEMANDEUR : } Au Fortin n°8.
Adresse : _____

INSTALLATEUR : } 1030 Bxl
Adresse : _____

TVA ou CI : _____

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

DISTRIBUTEUR : Electrabel.
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index : _____

Date du contrôle : 01/06/2004 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Appartement sous-sol
Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86
Raccordement : Tension 2x230 V Protection raccordement max 60 A
Câble aliment, tableau, princ. : 2 x 10 mm² Inter.gén. : type Δ40A0,3A
Type électrode de terre : boule - barrés - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 4 ; RA : 28 Ohm; RI tot 2 MOhm

DESCRIPTION :
voir schémas unifilaires et de positions.

Infractions constatées et/ou notes : rien.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le : 14-06-04
SIBOLGA
le responsable du distributeur
nom : _____
signature : [Signature]

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 01/06/2009 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
L'installation n'est pas conforme.
L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR : [Signature]
n° + nom + signature
Le directeur, _____

**GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : OKMEZ Voornaam : Hoik
 Naam van de onderneming :

Straat : Luene Fortin Nr. : 8 Bus :

Postcode nr. : 1030 Gemeente : BXL (Schoorbeek)

Telefoon : Fax :

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie – het onnodige schrappen) volgens het plan hierna.

in het gebouw gelegen te : .. Straat : Luene Fortin Nr. : 8 Bus :

Verdieping : Sous Sols Nr. gasmeter : Aplacan

Postcode nr. : 1030 Gemeente : Schoorbeek

voor rekening van : Naam : OKMEZ Voornaam : Hoik

Straat : Luene Fortin Nr. : 8 Bus :

Postcodenummer : 1030 Gemeente : Schoorbeek

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :

Adres :

uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 (1993) en Addenda 1 (1997) en 2 (1999) en/of aan de norm NBN D51-004 (1992).


Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. – 28.06.1971, d.w.z. "Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij overhandigd worden vóór de opening van de gasmeter.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Voorbehouden aan de installateur : | Voorbehouden aan de gasmaatschappij : | Datum : <u>21/06/2004</u> |
| B.T.W. nr. : | | Handtekening : <u>Hoik</u> |
| Aardgashabilitatie nr. : | | |

Model 710628/5

Bijlage(n) : ...

**EENLIJNSCHEMA VAN DE INSTALLATIE
ENOF IDENTIFICATIE VAN DE GEPLAATSTE TOESTELLEN**

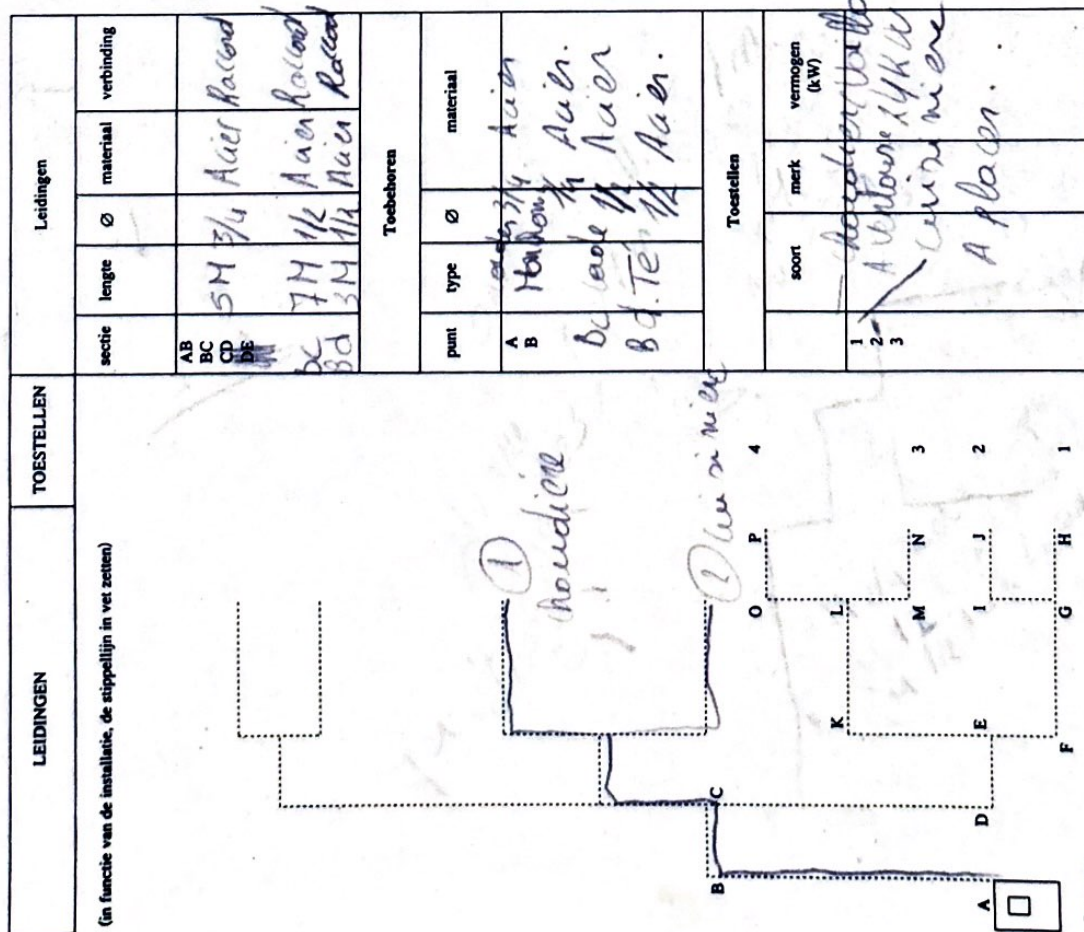

(*) bovenstaand schema wordt alleen als voorbeeld gegeven; de installateur mag eender welk schema/plan, dat minstens dezelfde gegevens bevat, bij het getuigschrift voegen.



RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION INTERIEURE DOMESTIQUE ALIMENTEE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

EXECUTE SUIVANT LES NORMES EN VIGUEUR PARMIS LESQUELLES LES NORMES NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN B61-001

Nom demandeur :
 Adresse : *Okmez Hank Av. Fortin n°8 1030 Bxl*

Organisme de contrôle :
 Adresse : *Bld. Clairs 15 1000 Bxl*
 Référence : 816 / 014 - 06 - 011 / 12
d d m m y y

Inspecteur : *86 F. Janssen*
 Tél. :
 ref. check-list : ARGB HAF-1000
 ARGB HAF-1003

Installation contrôlée : Adresse : *Av. Fortin n°8 1030 Bxl*
 *Appartement sous-sol*
 Date : *01.06.04* L'habitant est : propriétaire locataire

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : *Aflac* Classe G..... N° Index P_{max} :

Appareils d'utilisation: Description

| Nombre | Type | Marque | Puissance nominale |
|--------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 2 | 1 <i>Chaudière</i> | <i>Vaillant type C</i> | <i>24kW</i> |
| | 2 <i>Cassino</i> | <i>(Aflac)</i> | |
| | 3 | | |

Essai d'étanchéité : pas réalisé
 réalisé avec une pression d'essai de *100* mbar

Remarques : *rien*

L'essai d'étanchéité : a donné satisfaction n'a pas donné satisfaction

Conclusion

L'installation : est conforme **SANS autres remarques**, le compteur gaz peut être ouvert.
 L'installation : est conforme **AVEC d'autres remarques**, le compteur gaz peut être ouvert.
 L'installation : n'est pas conforme, le compteur gaz ne peut pas être ouvert

Résumé des remarques : néant

.....

Date : *01.06.2004*
 Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle : *86 F. Janssen*
