

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam:
Ident. Kaart nr.: Adres:
BTW nr.: BE 480.110.111 Post nr. + Stad: 9880 Aalter
Tel.: Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:	kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	Type aardelektrode:	
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type: XLB		
	Algemene differentieelstroominrichting: A / 3.00 mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen:
	☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 3 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: MΩ ☐ Controle foutlus ☐ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI

Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		
☐ Nihil		Naam:
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

EANDIS
Keuring gezien
Datum: 04/11/2008
Naam: V. Keymeir
Handtekening:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.


☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 03/11/2033 (*)
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering.

Agent bezoeker: Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: Agent nr.: 1003 Datum: 05/11/2008

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 1 ☒ Eindraadsschema('s): 1 ☐

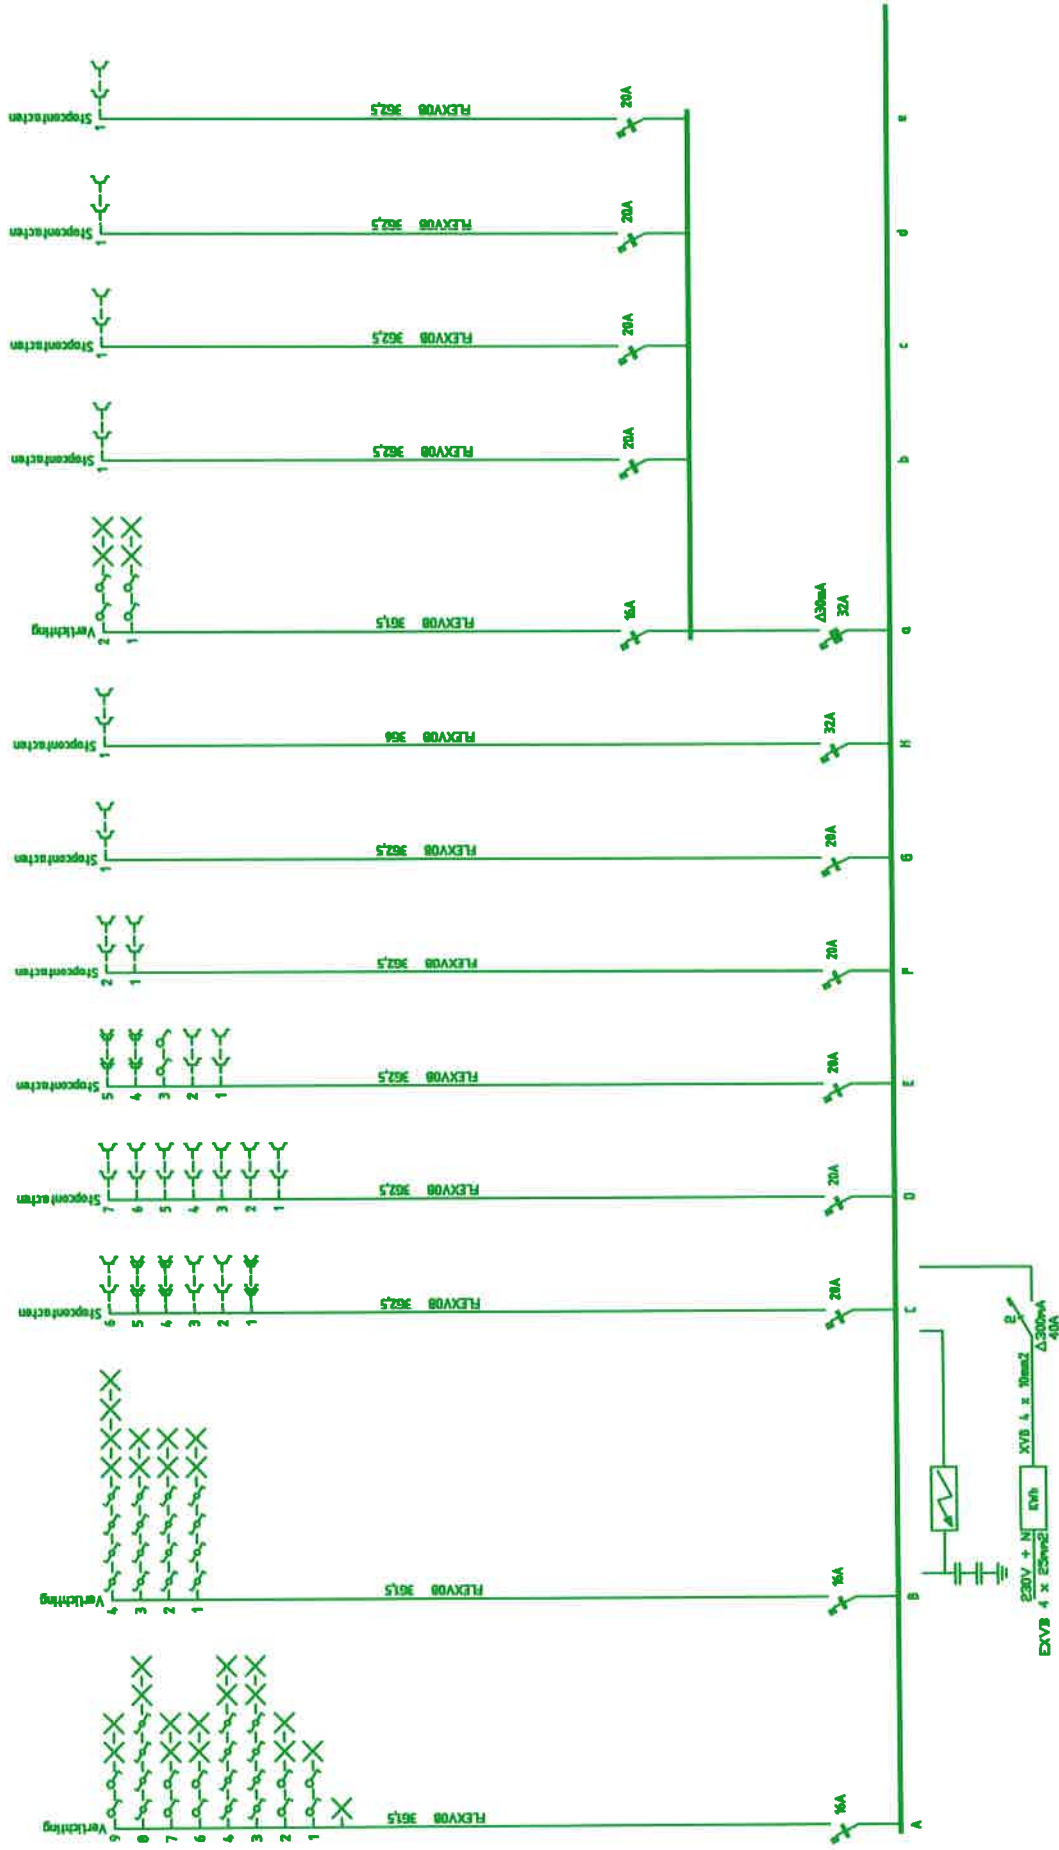

Get: WV



Datum: 31-10-2008

Project: MOLENHOF

ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
VAN DRIESCHE

Drogenbroodstraat 11 - 9880 Aalter
gsm: 0475/ 82 04 35 - fax: 09/374 09 45
e-mail: peter.vandriessche@telenet.be

Appartement: Tweede verdieping - 2E
EENDRAADSHEMA

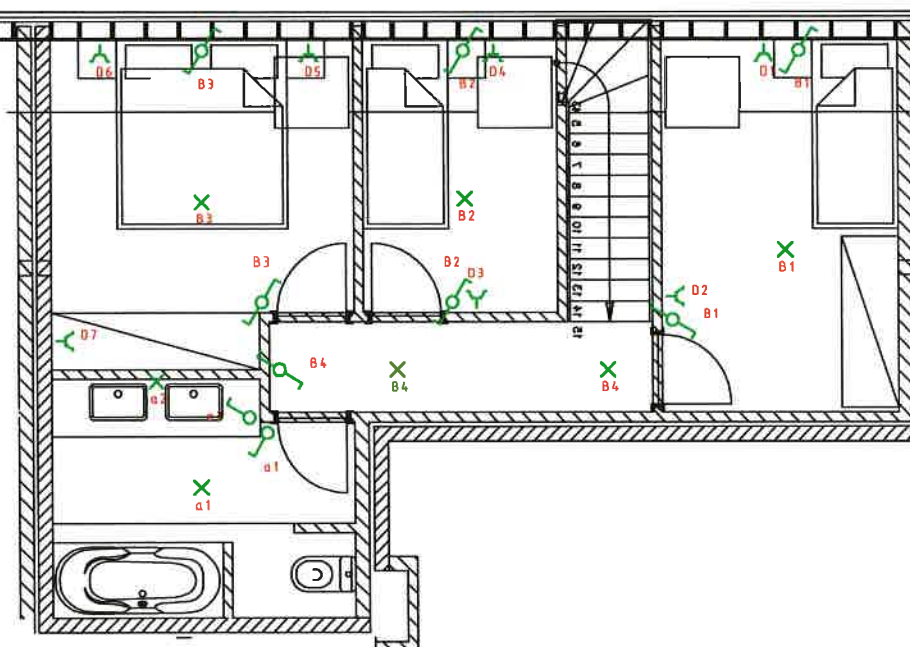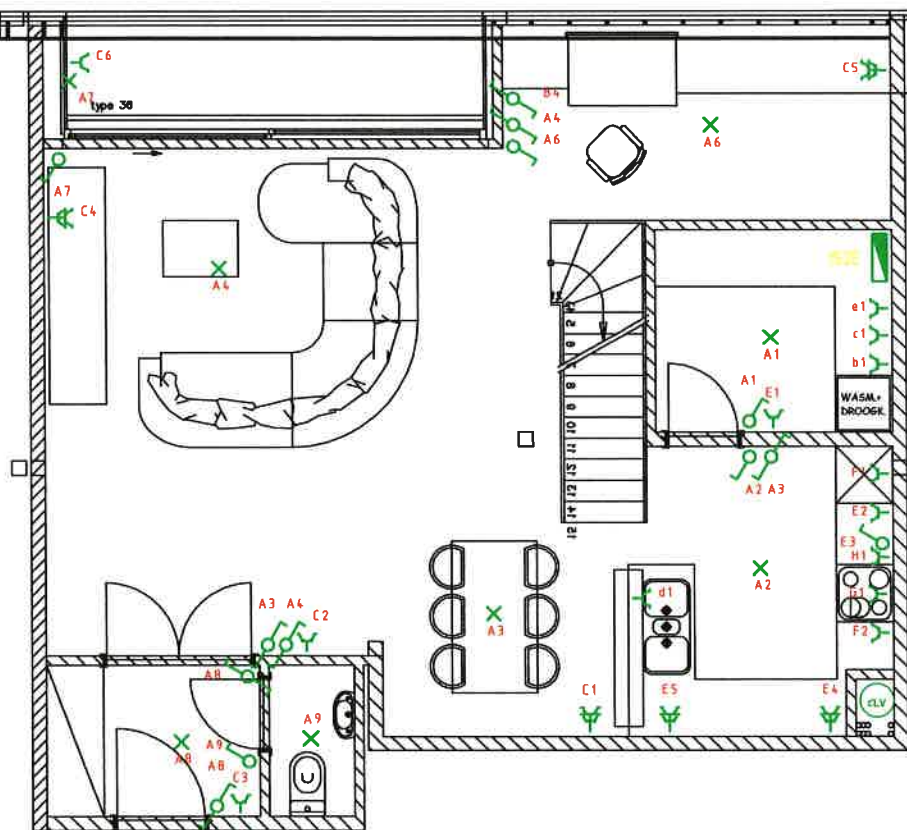

Get: WV

Datum: 31-10-2008



Project: MOLENHOF



ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
VAN DRIESSE
bvba

Drogenbroodstraat 11 - 9880 Aalter
gsm: 0475/ 82 04 35 - fax: 09/374 09 45
e-mail: peter.vandriessche@telenet.be

Appartement: Tweede verdieping - 2E
GRONDPLAN

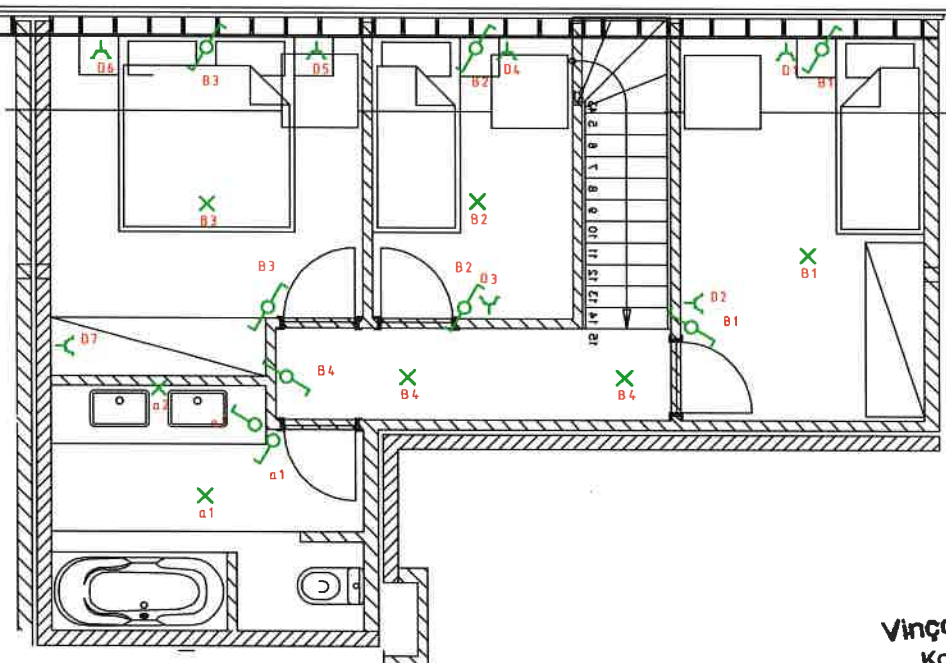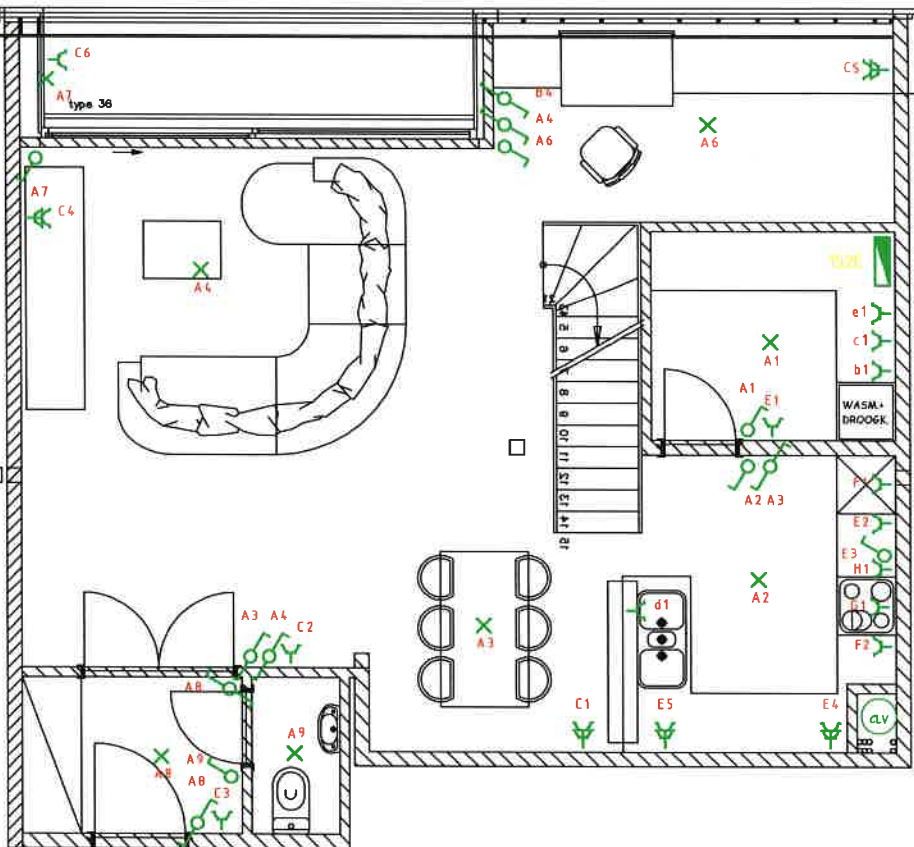

Vinçotte - Dhondt
Korte Boeken 37
9930

[Handwritten signature]

Get: WV

Datum: 31-10-2008

Project: MOLENHOF



ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
VAN DRIESCH
bvba

Drogenbroodstraat 11 - 9880 Aalter
gsm: 0475/ 82 04 35 - fax: 09/374 09 45
e-mail: peter.vandriessche@telenet.be

Appartement: Tweede verdieping - 2E
GRONPLAN
