



**VINCOTTE CERTIGO** - Vereniging zonder winstoogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME -  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**  
Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde  
Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be  
Contactpersoon:

• Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN / 19 / 70079782 / 00 / NL / 000  
Klantref.: BTOCGEN  
Contractref.:

• Uw gegevens  
Ref.:

• Interventiegegevens  
Plaats: Boslos, 13 9700 Oudenaarde  
Datum: 09/12/2014  
Uitgevoerd door: AV3679 - MAGERMAN SAMUEL

Boslos, 13  
9700 Oudenaarde  
België

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### INSTALLATIE

Naam:  
Adres: Boslos, 13 Post nr.: 9700 Stad: Oudenaarde  
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**  
idem
- **Plaats type**  
Wooneenheid

### BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle / verkoop
- Art 86
- Art 271 bis
- Art 278

### BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was niet verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 30/06/2040 door hetzelfde erkend organisme.(\*)

(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
Directeur Generaal



## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 29.9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 35 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN: 541448820069008106  
kWh meter nr.: 74834549  
Bescherming aansluiting: 32 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 3x230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - type: exvb  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/300mA  
Aantal borden: 2  
Bord(en): zie bijlage(n)  
Situatieschema('s): zie bijlage(n)  
Ééndraadsschema('s): zie bijlage(n)

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

R-O-F Nihil

### **- Bestaande installatie**

R-O-F nihil

## **ANDERE BIJLAGE(N)**

Nihil

ORIGINEEL

## Bord 1

- A: Bel
- B: Reserve
- C: Voeding bord 2
- D: Boorbamer
- E: stopcontact, keuker en belder
- F: stopcontact eetkamer + kamer 1-2 en 3
- G: keuker
- H: stopcontact eetkamer
- I: stopcontact kamer 1
- J: Verlichting + stopcontacten
- K: boorbout
- L: Verlies stroom 30 mA
- M: Verlies stroom 300 mA



## Bord 2


- N: ijskast
- O: chauffage betel
- P: garage, veranda, bot 1-2 en 3
- Q: microgolf
- R: vaatwasser
- S: wasmachine
- T: algemener:-




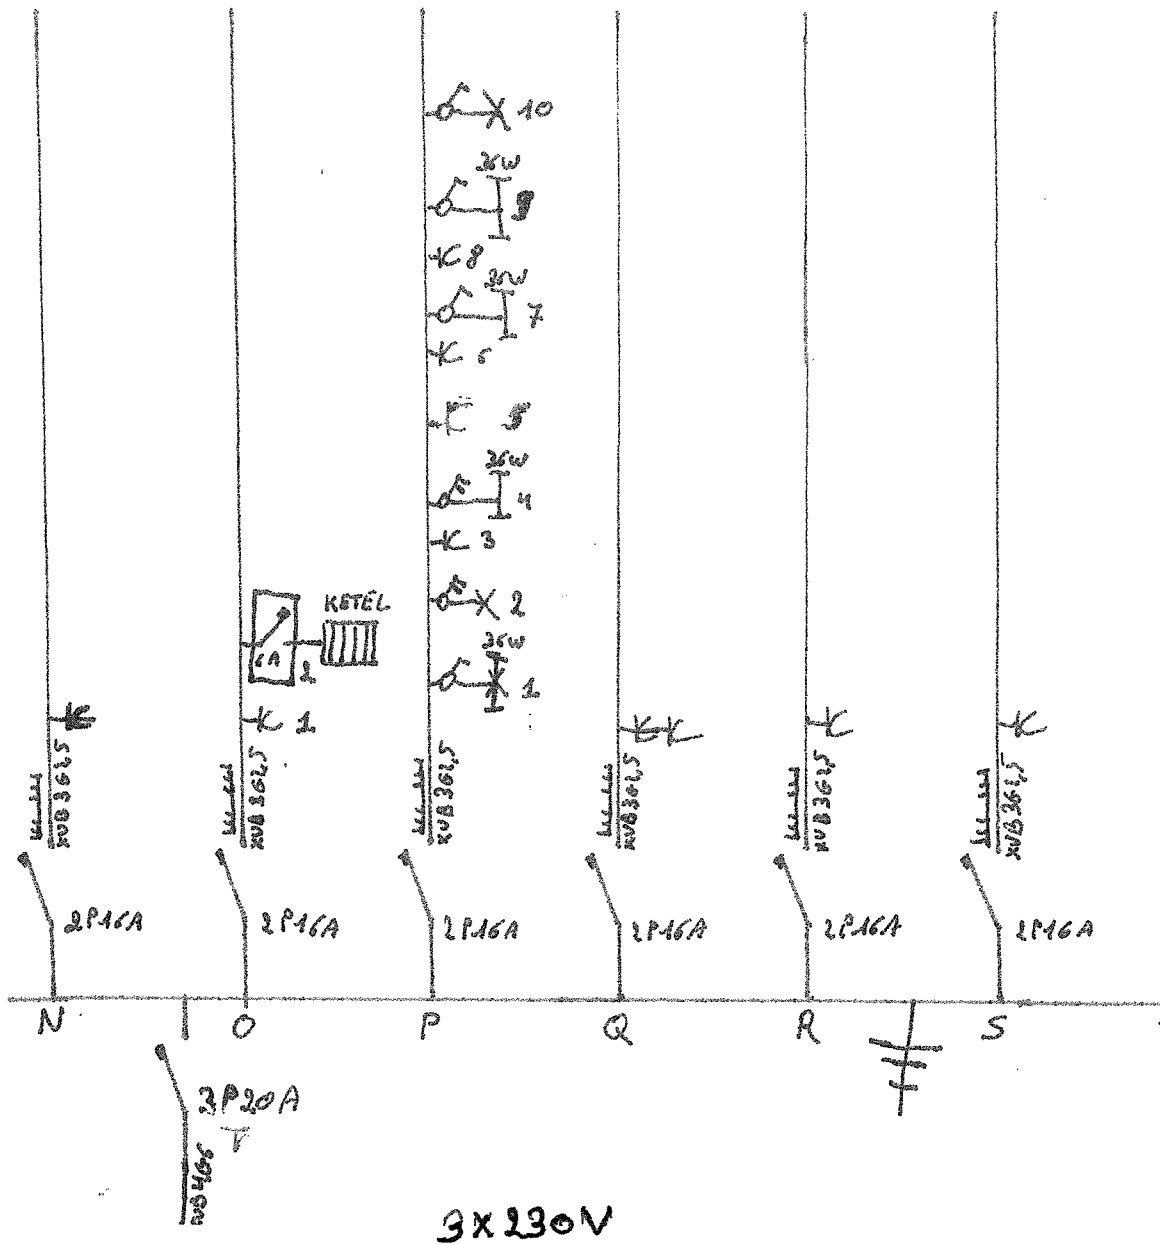
Samuel MAGERMAN  
Inspecteur  
3679

30/06/2015

INSTALLATIE ADRES	EIGENAAR	
Boulaux nr 13 9700 Diekenenome	Boulaux nr 13 9700 Diekenenome	  Samuel MAGERMAN Inspecteur 3679

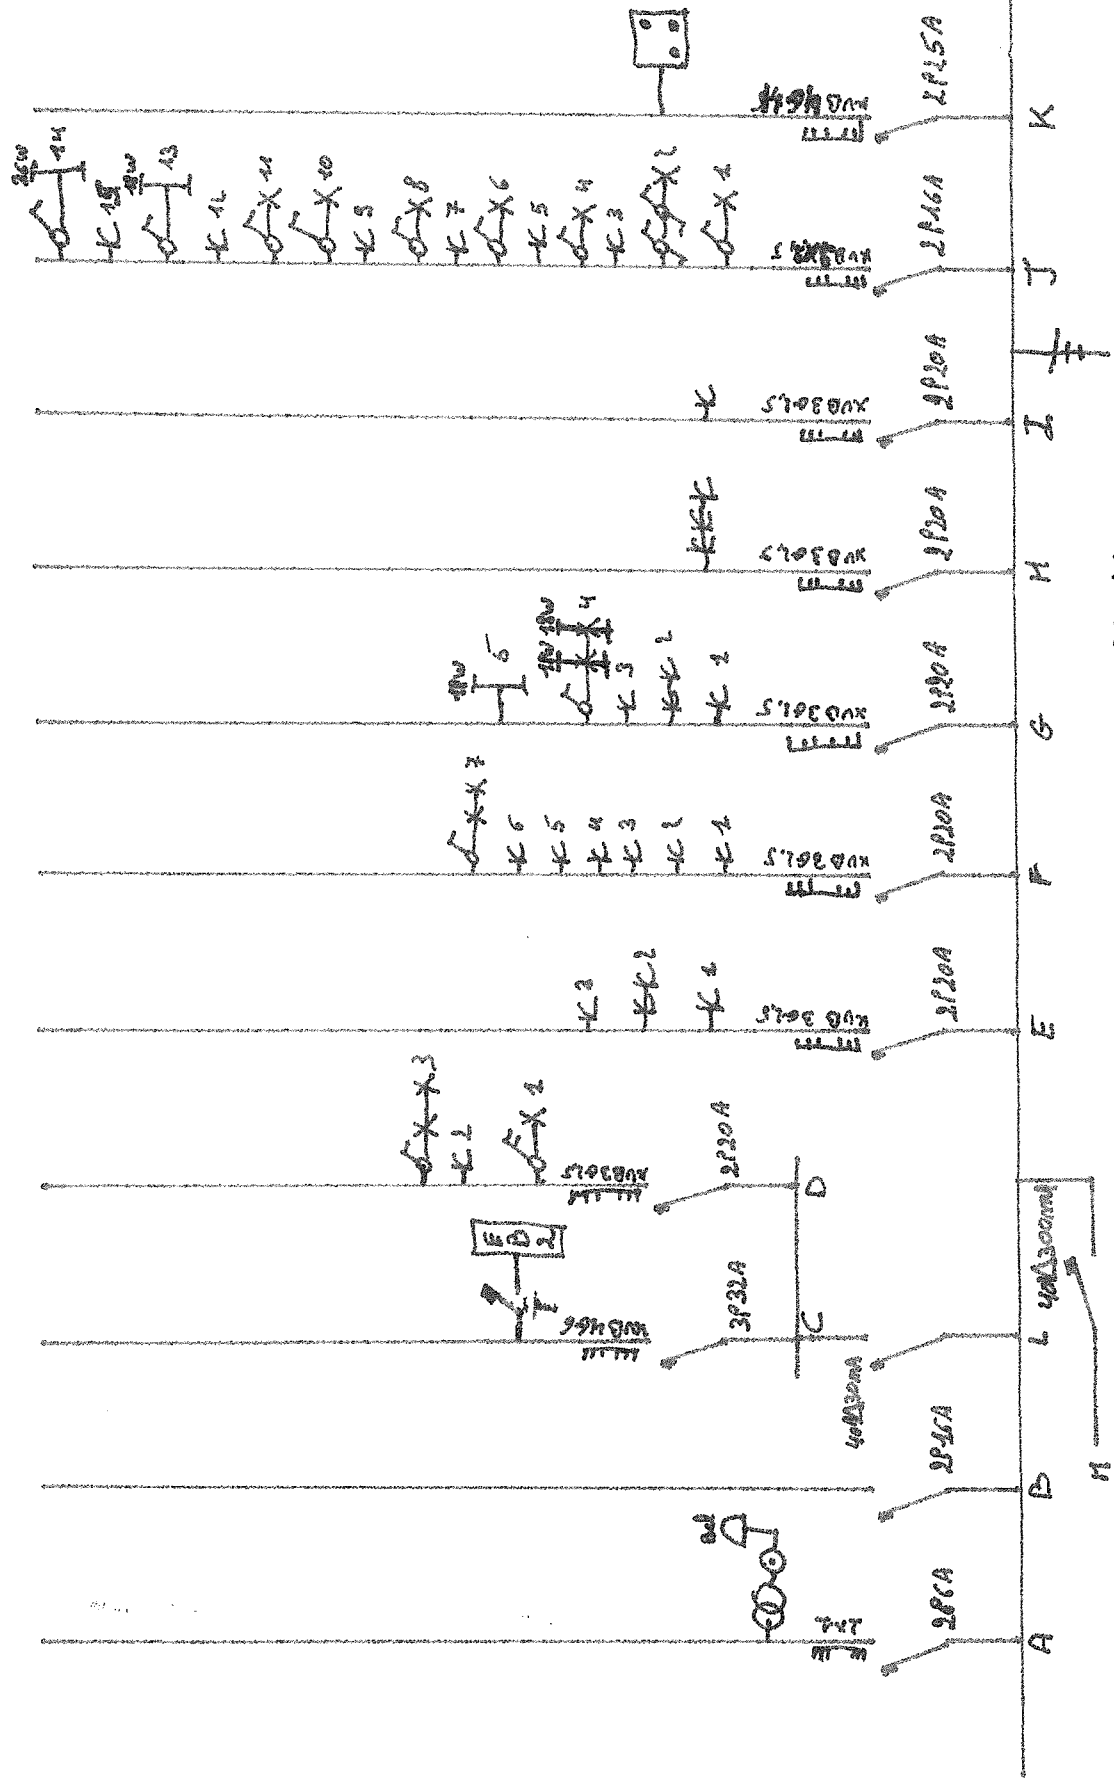


INSTALLATIE ADRES	EIGENAAR	
Basles nr 13 9700 Wierdenname	Basles nr 13 9700 Wierdenname	 Samuel MAGERMAN Inspecteur 3679



Bord 2



# GRONDPLAN BOVEN

INSTALLATIE ADRES	EIGENAAR	
Boslas m 13 9700 Neelkenname	Boslas m 13 9700 Neelkenname	 Samuel MAGERMAN Inspecteur 3879

