

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 21/10/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 21/10/2022
Verslagnummer: 0724-221021-07

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0724

Identificatie van derden:

Opdrachtgever:
Adres: MAASTRICHTERSTEENWEG 11A/6, 3770 RIEMST
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
Adres: VISESTEENWEG 225, 3770 RIEMST
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam:
Adres: VISESTEENWEG 225, 3770 RIEMST
EAN- code:
Nummer teller: 6.858.350
Index:
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Handelspand

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5), Eerste controle volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 Wegens het ontbreken van meerdere voedings en verbruikerskabels (oa tussen teller fluvius en verdeelbord en algemene bekabeling tussen de verbruikers en verdeelbord onderling) kon deze controle niet gebeuren zoals gebruikelijk.
- 2 Het industriële bord geplaatst in de kelder behoort niet tot deze controle (geen in of uitgaande bekabeling aanwezig/bekabeling automaten afgekeknippt)
- 3 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er geen spanning aanwezig was.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: niet aanwezig - Doorsnede: niet aanwezig mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar:

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 17 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Bord gelijkvloers winkel

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: volledig bord

10 kringen 2P aut. 16 A 1,5 mm² XVB

7 kringen 2P aut. 20 A 2,5 mm² XVB

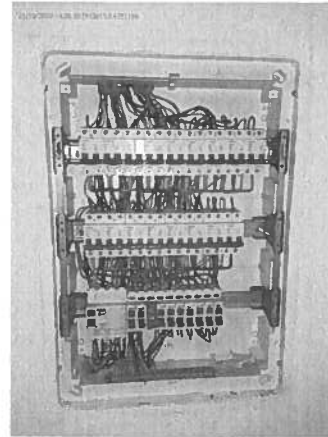

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: Zie inbreuken

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: # Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: # MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 3 Niet alle verplichte gegevens zijn op elk bord vermeld (volgnummer, voedingsspanning, aardverbindingssysteem, kortsluitstroom, filliatietechniek indien toegepast)(Boek 1: 3.1.3.3).
- 4 Het situatieplan van de aardverbindingen ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 5 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 6 De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).



Opmerkingen:

- 1 De installatie dient algemeen hersteld en conform Boek 1 gebracht te worden.
- 2 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie zal bij het volgende controlebezoek de conformiteit opnieuw moeten nagegaan worden.
- 3 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.
- 4 Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht komen.

Besluit van de controle:

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0724-221021-07

3 / 3
