

origineel



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P035552059/INT



N 093505

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- Brabant tel.: 02 674 57 11
- Wallonië tel.: 081 432 611

51

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <i>CD - Technics</i>	Naam, voornaam : <i>Maarten Dele</i>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <i>1000 Brussel</i>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <i>1050 Elsjeem</i>
	Tel. : <i>02 674 57 11</i>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  .....

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input type="radio"/> ① Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
		<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....			<input type="radio"/> ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <i>3596787</i>	meterstand dag : .....	nacht : .....
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input checked="" type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :	nr. : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input checked="" type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <i>5</i> X <i>6</i> mm <sup>2</sup> - Type : <i>VVB</i>	<input checked="" type="radio"/> bestaand	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : .....	Aantal borden : <i>4</i>	Aantal eindstroombanen : <i>6</i>
<input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)	<i>Dif 60 mA 30mA</i> <i>2 borden 20A (op 700V)</i> <i>2 borden 20A (op 100V)</i> <i>2 borden 40A (op 100V)</i>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input type="radio"/> Schema's
<input type="radio"/> Aardingsweerstand : .....	<input type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : .....	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="radio"/> Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór *22/09/2015* (\*)  door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : *Storms Lul* Agent nr. : *3555* Datum : *21/09/2015*

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieschema('s) : *2*  Eéndraadsschema('s) : *1*

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

origineel



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 3555 20 29 / NT



N 090370

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

12

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: CD Techies
Naam, voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 271 bis, Art 278, Art 88, Art 87, Art 80, Art 100, Art 230 V, 3x230 V, 3N400 V, Type aardelektrode, Voedingsleiding hoofdbord, Algemene differentieelstroominrichting

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr., meterstand dag, nacht, Bescherming aansluiting (A)
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN, Maximale nominale stroom (A), Voedingsleiding hoofdbord
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting, Aantal borden, Aantal eindstroombanen

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: 1203-1218 (bestaande stop. kelder)
Opmerkingen: Nihil


Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet/voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet/voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:
Naam: Storms L.H. Agent nr.: 3555 Datum: 29/06/2015
Bijlage(n): Situatieschema(s), Eëndraadsschema(s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.001.0.2.22

# Eendraad schema en bord layout

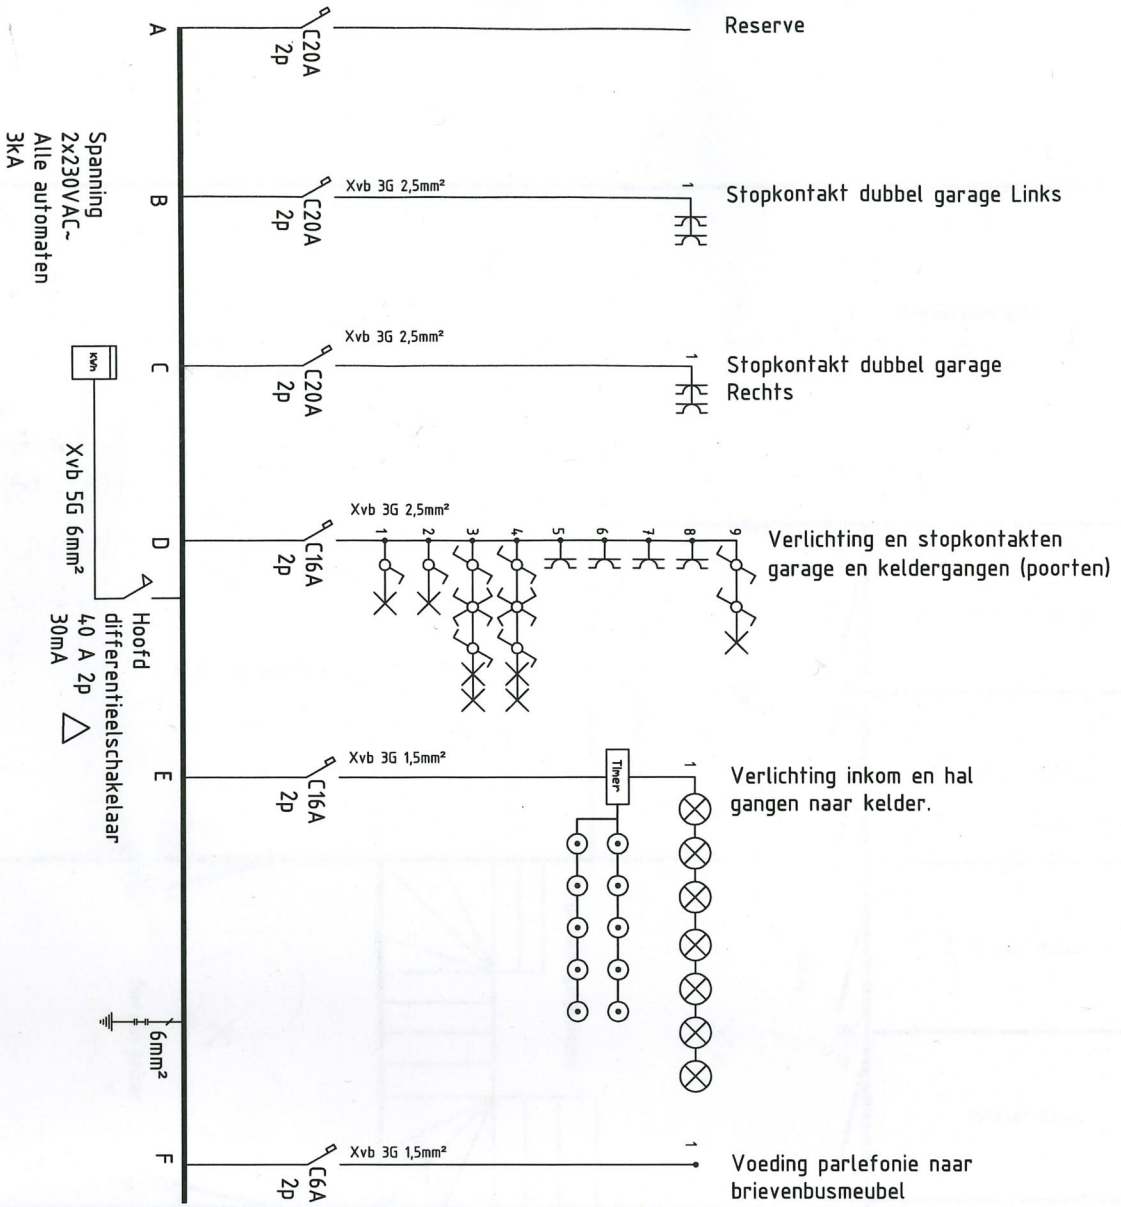

Spanning  
2x230VAC-  
Alle automaten  
3KA

Hoofd  
differentieelschakelaar  
40 A 2p  
30mA

Lijnbeveiligingen								
A	B	C	D	E	F			
C20A	C20A	C20A	C16A	C16A	C6A			
2p	2p	2p	2p	2p	2p			
E L P A								
<table border="1"> <tr> <td>Diff</td> <td>40A</td> <td>30 mA</td> </tr> </table>						Diff	40A	30 mA
Diff	40A	30 mA						
Hoofdschakelaar Personenbeveiliging								



LUK STORMS  
Inspecteur  
0476/ 98 59 54

20/06/2015

Date

Adres


Installateur

Grote Dries 4 te 2650 Edegem

Tekening nummer

0001

# Situatieschets Garage en kelders

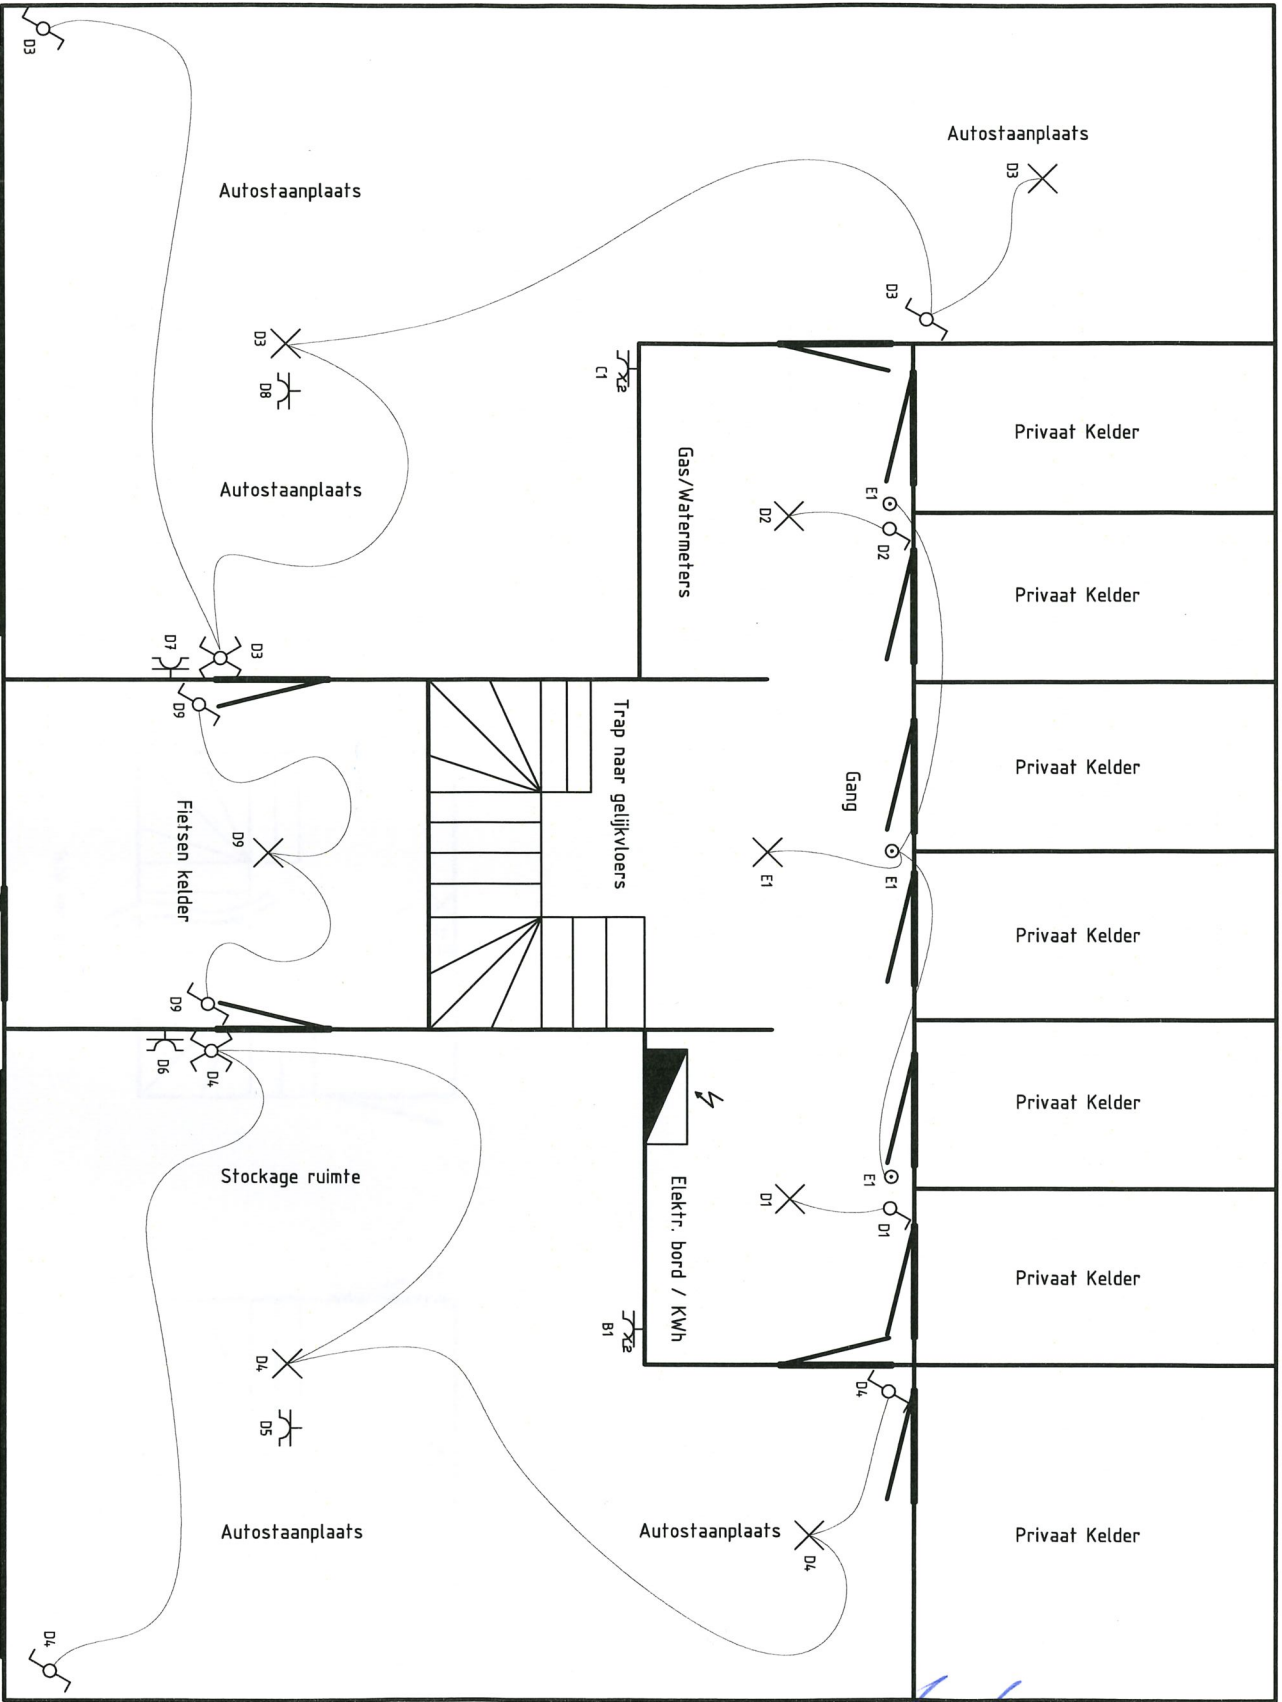

25/06/2018

**VINCOTTE**


LUJK STORMS  
Inspecteur  
0476/ 98 59 54

Date	Adres	Grote Dries 4 te 2650 Edegem	Tekening nummer
Installateur			0002




LUK STORMS  
Inspecteur  
0476/ 98 59 54


29/06/2015

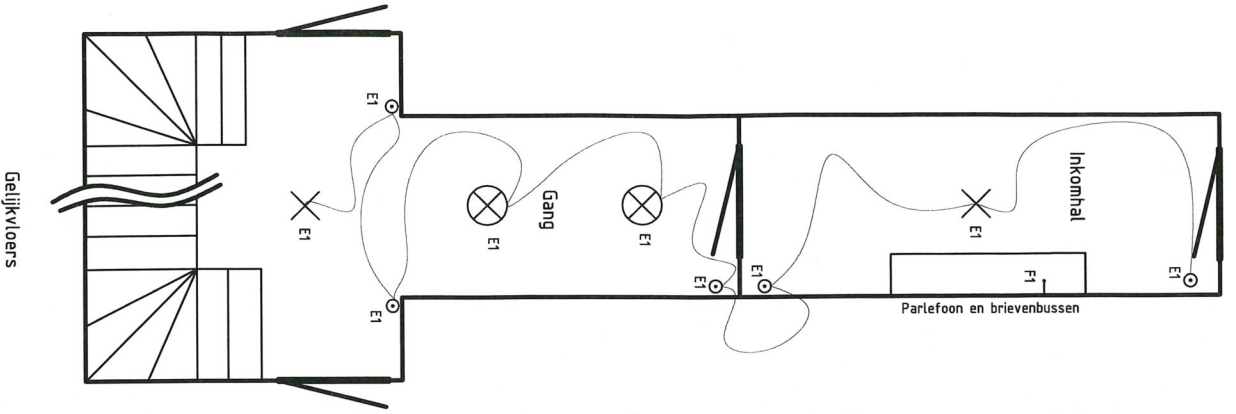

Gelijkvloers

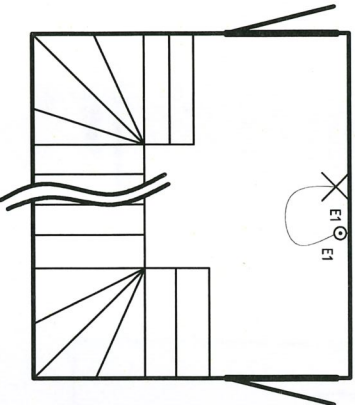

1ste verdieping

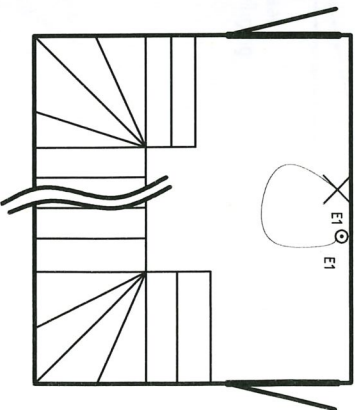

2de verdieping

# Situatieschets Gelijkvloers en verdiepingen

Date

Adres

Grote Dries 4 te 2650 Edegen

Tekening nummer

Installateur

0003
