



## DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

**Datum(s) van controle:** 29/10/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 29/10/2020  
**Verslagnummer:** 0063-201029-06

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

**Naam:** Technisch Bureau Verbrughen  
**Adres:** Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
**T:** 011 42 18 34 **E:** [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be) **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616  
**De agent-bezoeker:** nummer 0063

### Identificatie van derden:

**Opdrachtgever:** ORIS - OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES  
**Adres:** KORTRIJKSESTEENWEG 1005, 9000 GENT  
**Naam eigenaar, uitbater of beheerder:**  
**Adres:** BORGWORMSESTEENWEG 88, 3800 SINT-TRUIDEN  
**Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:** Onbekend  
**Adres:**  
**BTW-nummer:**

### Identificatie van de elektrische installatie:

**Naam:**  
**Adres:** BORGWORMSESTEENWEG 88, 3800 SINT-TRUIDEN  
**EAN- code:**  
**Nummer teller:**  
**Private hoogspanningscabine:** Nee  
**Type installatie:** Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

**Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:** Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2)  
**Datum uitvoering van de installatie:** Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:** Geen

**Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019:** toegepast

**Ander(e) wettelijk(e) kader(s):** n.v.t.



**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 6 mm<sup>2</sup>

Type algemene schakelaar: 4p 25A/300mA

Type aardelektrode: Onbekend

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal borden: 2

Aantal stroombanen: (13) (reserve  
inbegrepen)**BESCHRIJVING:**Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 25 A 300 mA type AC,  
beschermde stroombanen: 13

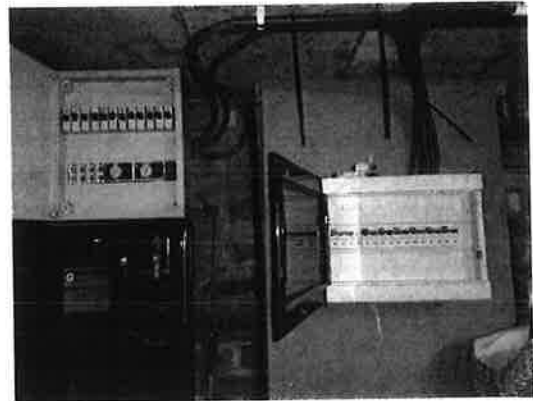
Borden tellerkast garage

Diff 25A/300mA 4p

Diff 40A 30mA 4p

12 x penaut 16A/?/20A

1 x aut 32A 4p, 6 x aut 20A 2p

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 50 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: &gt; 0,5 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: NOK

**Vastgestelde inbreuken:**

- 1 Het ééndraadsschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1).
- 3 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
- 4 De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (Boek 1: 5.3.5.5).
- 5 Het bord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1: 4.2.2.3).
- 6 De waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding is te hoog (Boek 1: 5.4.2).
- 7 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1: 5.2.9.6).
- 8 Er is geen continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact (Boek 1: 5.4.3.4).

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

Verslagnummer 0063-201029-06

2 / 3

**4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.**

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



**2. In het geval van een controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop:**

**De verkoper is ertoe gehouden:**

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

**De koper is ertoe gehouden:**

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



