


Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

DIT RAPPORT ANNULEERT EN VERVANGT HET VORIGE RAPPORT 85/2021/89244/01:2

REF. 85/2021/89244/01:3

DATUM VAN CONTROLE 14/12/2021 AGENT David Godts
ADRES VAN CONTROLE Noordstraat 4 / 3 (verdieping 1) - TYPE CONTROLE Controlebezoek (6.5.)
2220 Heist-op-den-Berg

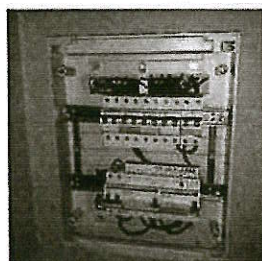

ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Noordstraat 4 / 3 (verdieping 1) - 2220 Heist-op-den-Berg
Type van lokalen Woonruimte (appartement)
Elgenaar
Verantwoordelijke voor de werken
#BTW
Afwijking van toepassing/toegepast
Organisme achter de vorige PV ACEG
Referenties van de vorige PV 457131

GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) EANDIS (operator DNB)
EAN code 541448820058950584
Nummer teller 4923670
Meterstand dag/nacht 06932,4/
Type van de algemene schakelaar Teco
Voedingskabel hoofdbord VVB 6mm²
Nominale spanning 3x400V + N - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 15A

CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieplan	OK	Aantal verdeelborden	1	Aantal stroombanen	8
Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan					
De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	schak - 40A - 300mA - type A - test OK		
Aardverbindingssysteem	Staven	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Aardingsweerstand (Ω)	14,58	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	OK		
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	Zonder voorwerp	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	OK		
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK		
Foutlus controle	Voldoende	Algemene isolatieweerstand (MΩ)	36,3		
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	OK		
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	OK		

BESLUIT : CONFORM



Op de datum 14/12/2021, elektrische installatie Noordstraat 4 / 3 (verdieping 1) - 2220 Heist-op-den-Berg is conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 14/12/2046.
De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening agent

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

DIT RAPPORT ANNULEERT EN VERVANGT HET VORIGE RAPPORT 85/2021/89244/01:2

REF. 85/2021/89244/01:3

OPMERKINGEN

- Buiten een vernieuwing van de elektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.

Herinnering aan de wettelijke voorschriften :

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is er toe gehouden:

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning


ORIGINEEL EXEMPLAAR

DIT RAPPORT ANNULEERT EN VERVANGT HET VORIGE RAPPORT 85/2021/89244/01:2

REF. 85/2021/89244/01:3

BIJLAGEN

Eendraadschema(s) van de installatie

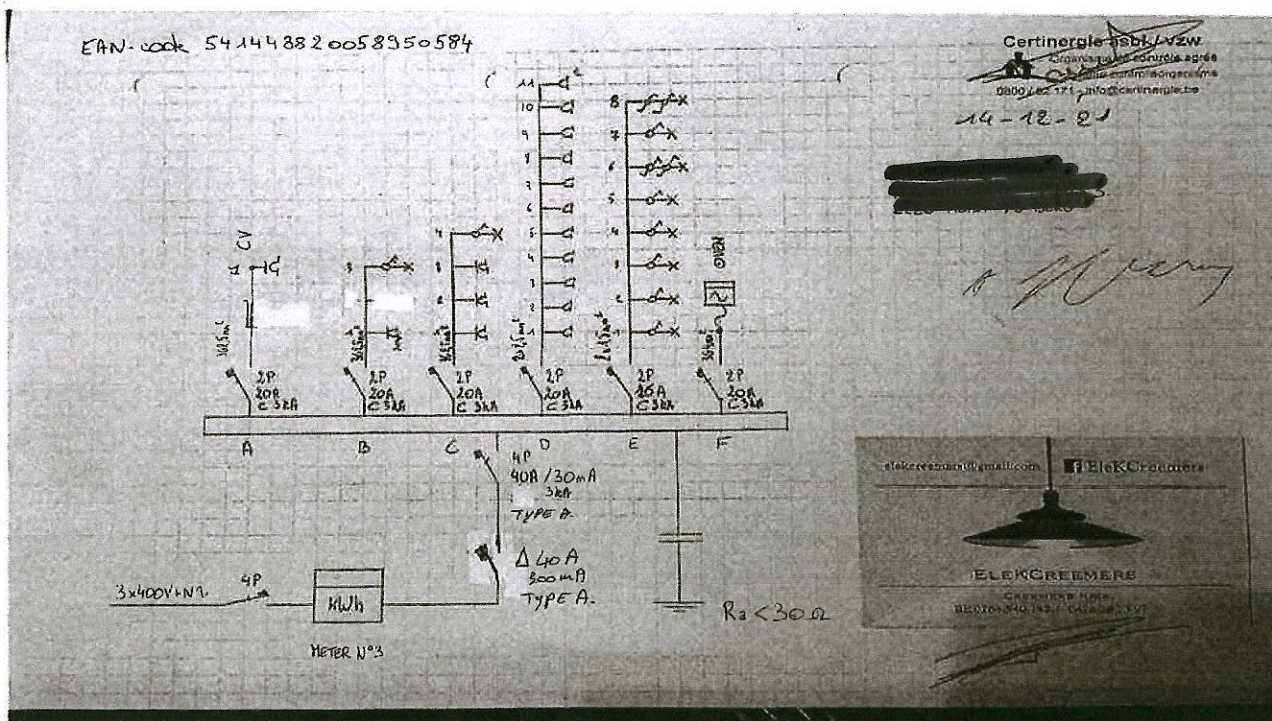

Situatieplannen van de installatie

