

Resp. client:
N° commande:
N° client: 77410
Pers. cont.: -
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: moens.electricite@gmail.com

ProKo.: LS01
N° rapport : 4474595-02
N° rapp. prov.: -
Date: 06/10/2014

Client / Mandant :
MOENS MICHEL ELECTRICITE
RUE DU MONT 10
6940 WERIS

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: _____ **Type d'installation:** renouvelée **Type de locaux:** maison
Lieu de contrôle: RUE DU BEAU SITE 63 WALTZING 6700
Type de contrôle: examen de conformité **Selon RGIE Art. 86/270/278**
Date du contrôle: 04/10/2014 **Contrôle suivant dans** 0 **mois, ou avant** 31/10/2014 **Contrôleur:** ROLAIN JONATHAN
Propriété de: _____
Installateur: MOENS
T.V.A.: 0646 942 229 **Carte-ID :** - **Délivré à :** - **Date :** -

DESCRIPTION

EAN n°: 641449020704383363 **N° compteur:** 20292618 **Index I:** 041243,0 **Index II:** 029911,0
Raccordement: réseau souterrain au aérien **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension de serv.: 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection principale :** -3P 32A **Interr.:** aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 10 mm²
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm² **Résistance de dispersion:** 28 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 40A/300mA **est plombé par des scelles d'OCB:** p.a. **Diff. supplém.:** 4p 40A/300mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre **Contrôle boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général :** > 1 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct : en ordre **contact indirect:** en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre
Description – appareils : ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ - d'eau
Ne sont pas encore raccordé: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 20

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Récepteurs non placé
N	Les prises de courants sons broche de terre ne peuvent être utilisées qu'avec du matériel de classe 2


CONCLUSION



L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

Rolain J



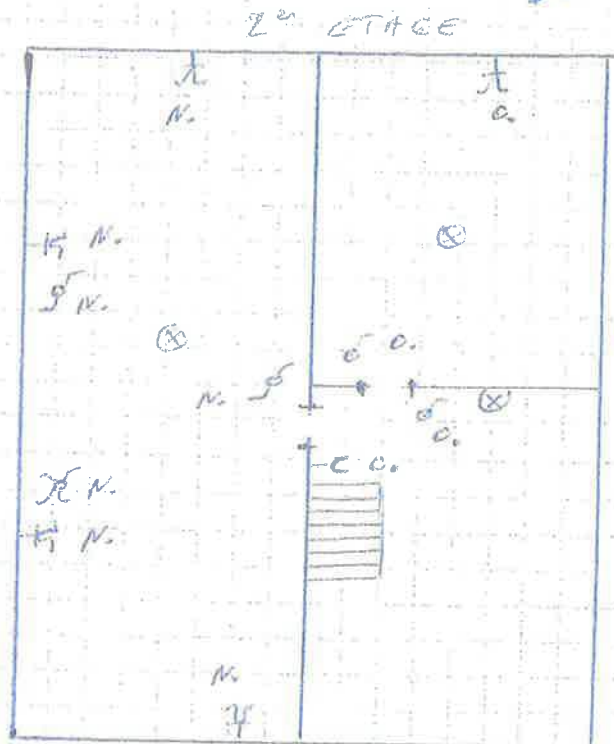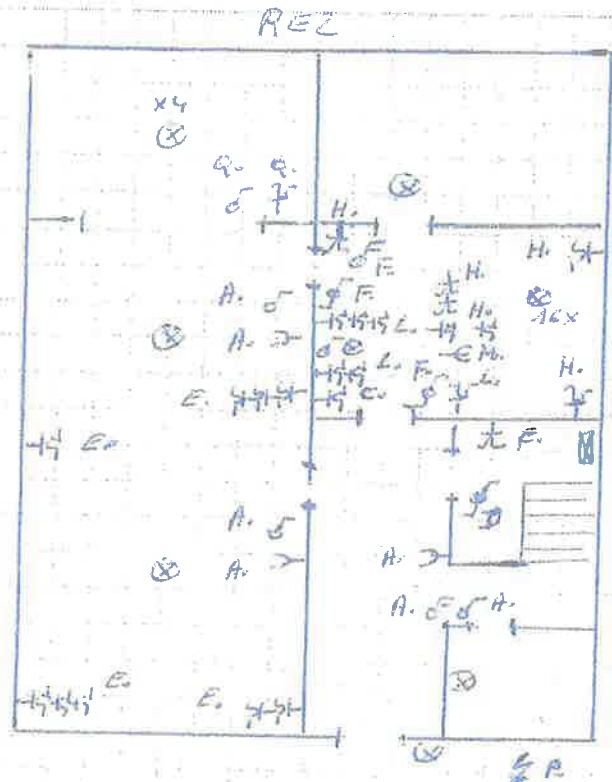


RODOLPH JOHANN
CEM 03030245.727
johann.rodolph@ob.be

CHILDREN'S LITERATURE

TEL. & FAX 086 21 03 08 GSM 0495 82 04 82 EMAIL moens.electricite@gmail.com

N° 2032518 IT: 041243,0
541443020704383363
Exub 162 32A
Exub 162

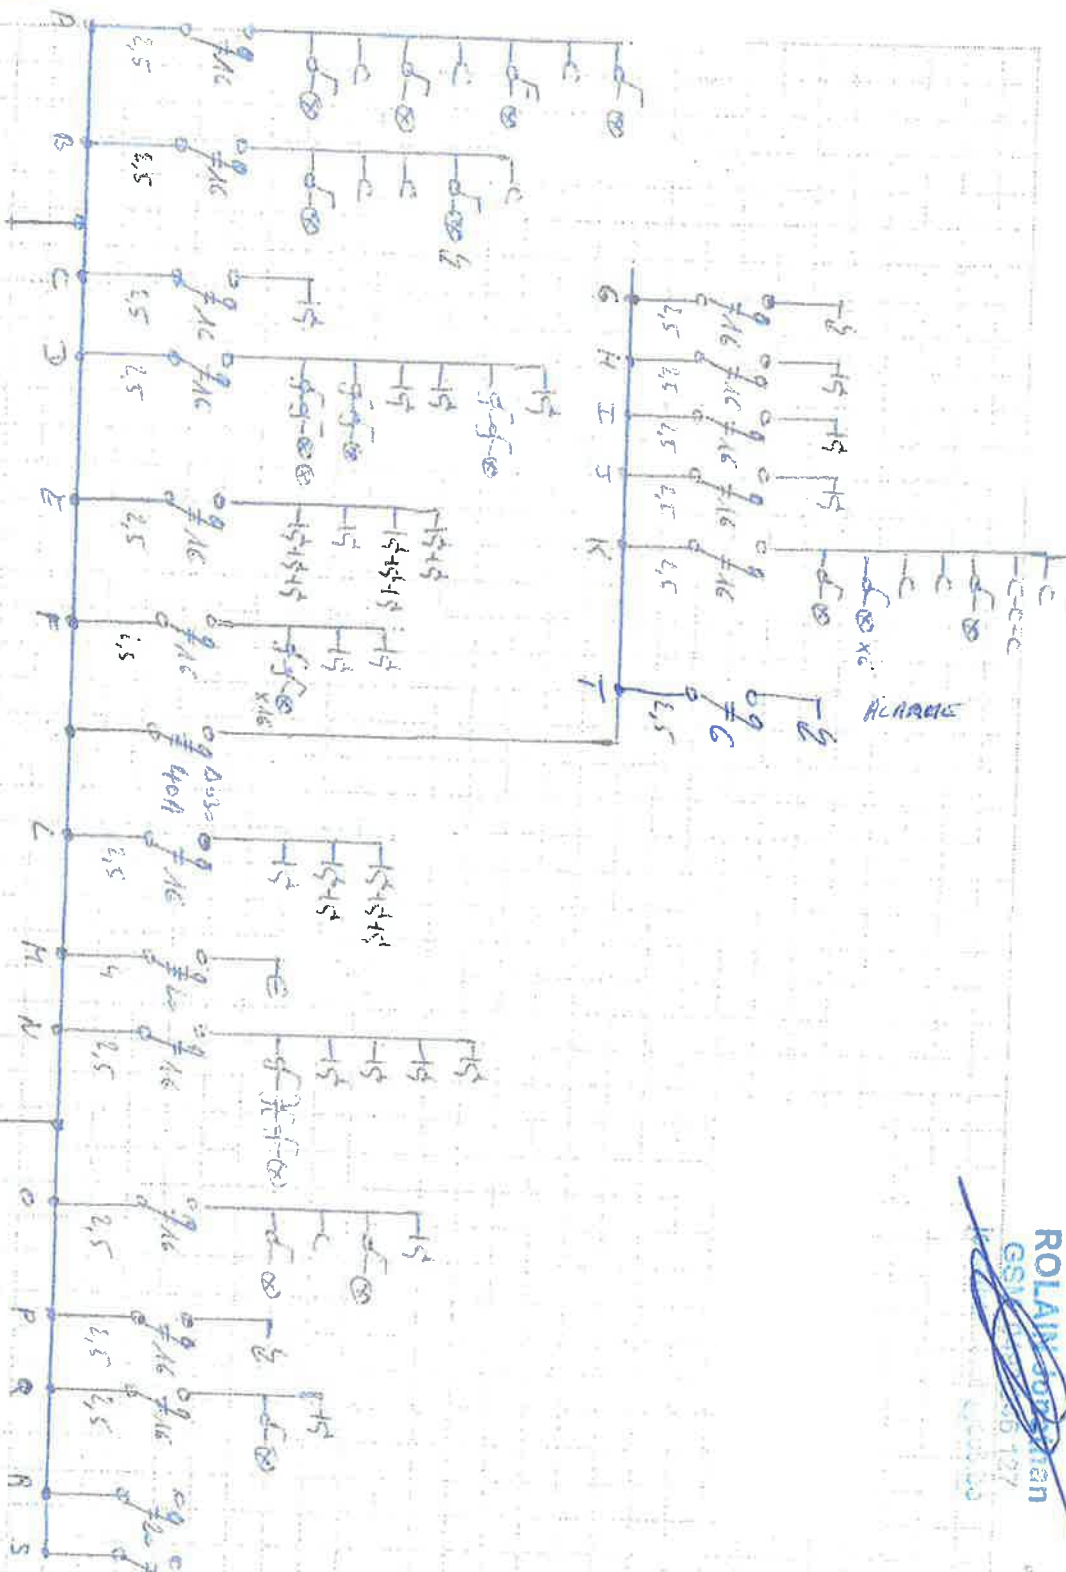

ROLAND JORDAN
GSM 0495 82 04 82
06 127
