

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/08/2026

Inspecteur: Yaaron Van Cronenburg

Mentor:

Installateur: Vansielegheem Leendert

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0788 907 334

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251317

Datum verslag: 20/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Jan Breydellaan
Huisnummer 32
Busnummer 2
Postcode 8200
Gemeente Sint-Andries
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Vansielegheem Leendert
BE 0788 907 334
+32 495 39 77 52
elektriciteitleendert@gmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820040863359



Teller Nr. : 1LGZ0568978796

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 9


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,282 MΩ

RE: 11,66 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zle eendraadschema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N31 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/8/2051
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:14 tot 12:39

De inspecteur Yaaron Van Cronenburg


Yaaron Van Cronenburg
ACEG VZW - #298

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte​sreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/8/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



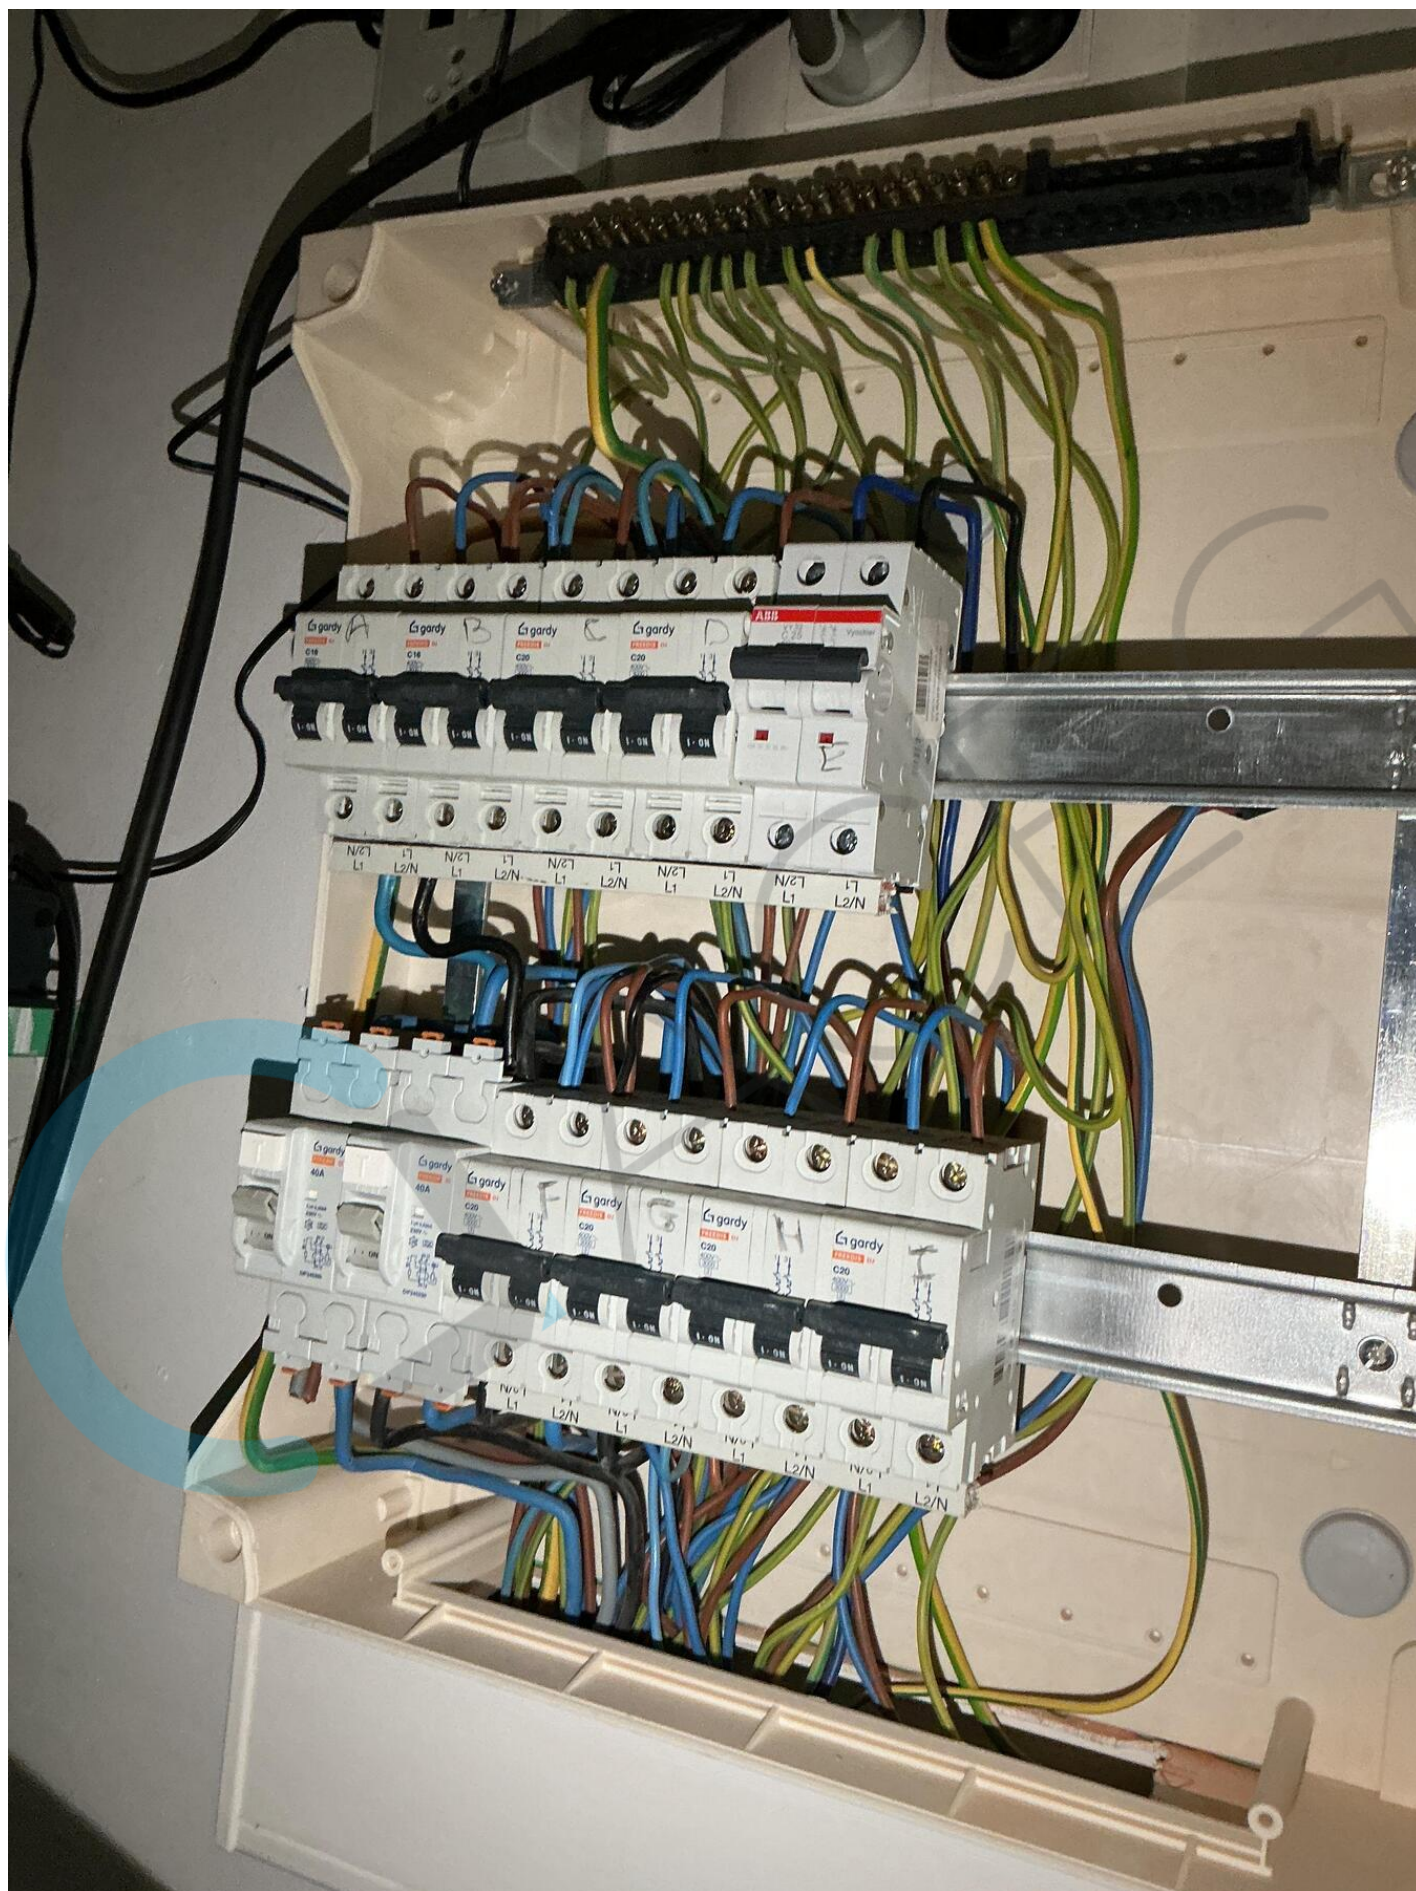

4×10^2 $40A$ 2×10^2 $40A$ $2P$ $\Delta 300mA$
 $230 V$

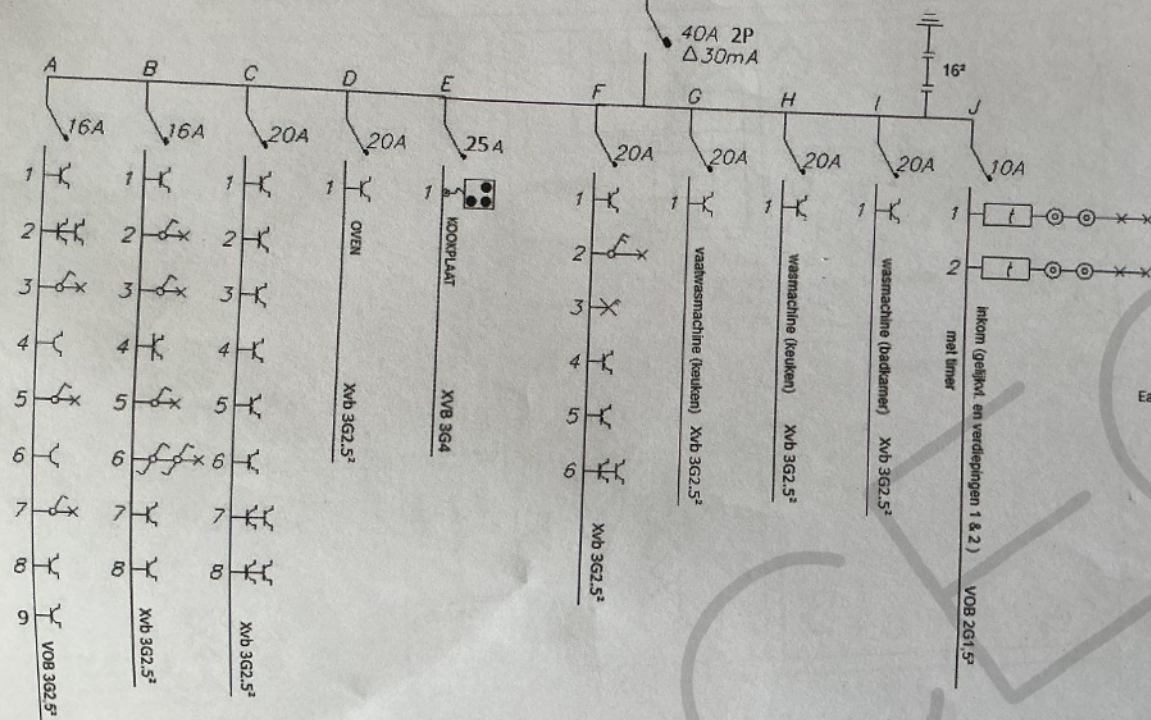


[REDACTED]

Jan Breydellaan 32
1e verdiep, Bus 2
8200 Sint Andries

QACEG 298
 Richard van der Grinten / Organisator
Yaaron Van Cronenburg

Elektriciteitsplan 1e VERDIEP

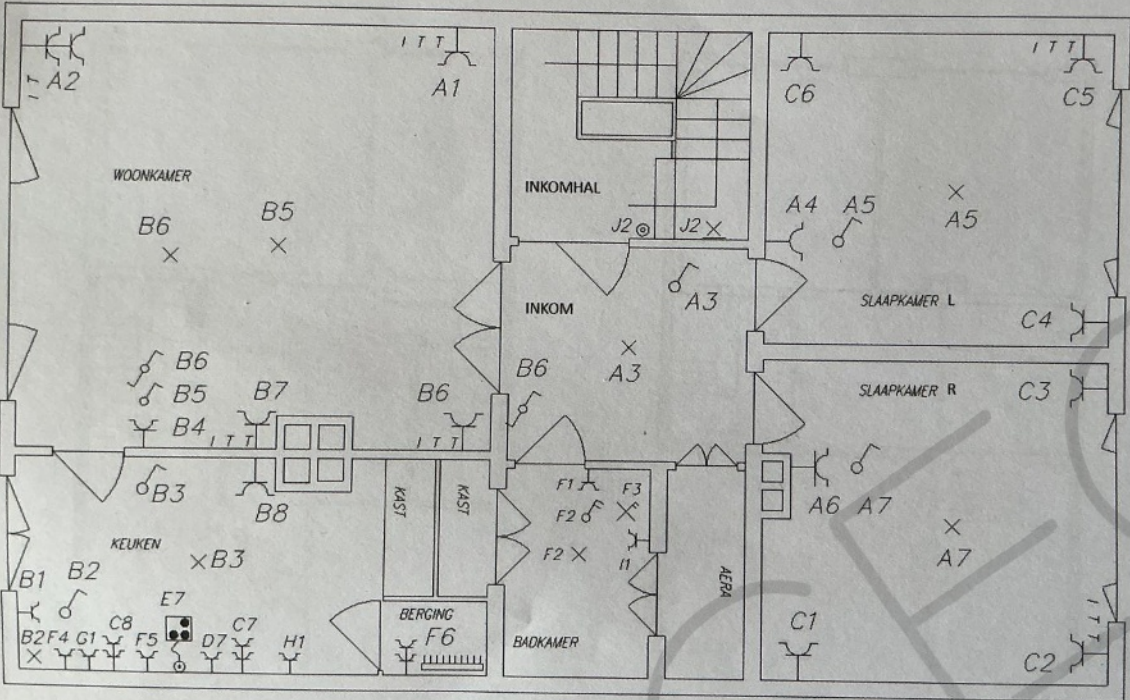

Verantwoordelijke uitvoering der werken:

Eigenaar:

Plaats van uitvoering:

Jan Breydellaan 32
1e veriep, Bus 2
8200 Sint Andries

QACEG 231
Jaaron Van Cronenburg

I T T : internet, telefoon, TV

Elektriciteitsplan

Verantwoordelijke
uitvoering der werken:

[Redacted]


Eigenaar:

[Redacted]


Plaats van uitvoering:

Jan Breydellaan 32
1e veriep, Bus 2
8200 Sint Andries

QACEG 258
Yaron Van Cronenburg

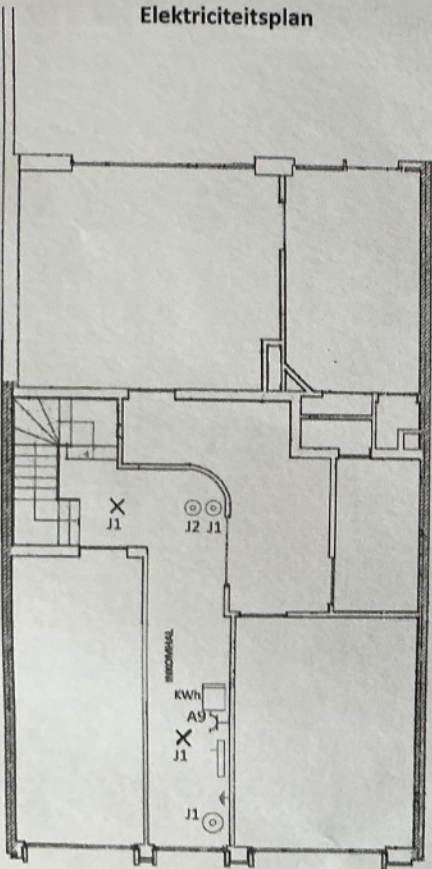

Gelijkvloers

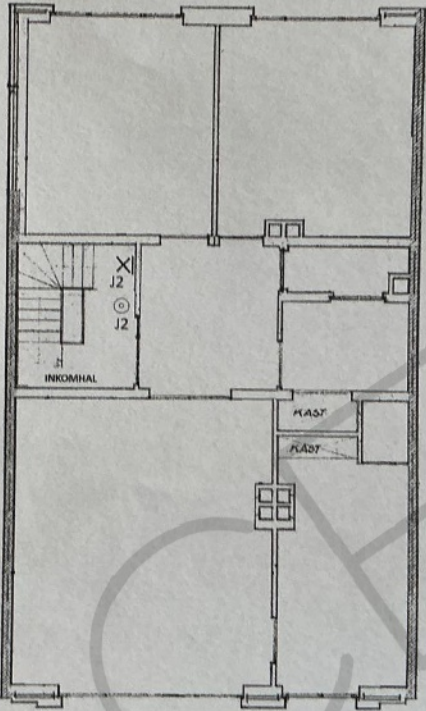

2e Verdiep





