

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Bruxelles | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tél. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 5000 NAMUR
RUE DES CARREES, 57

PROPRIETAIRE : _____

Adresse : _____

DEMANDEUR : IDEM

Adresse : ZONING FERNELMONT

INSTALLATEUR : _____

Adresse : _____

TVA ou CI : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index : _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 28/09/2017 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Rn

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : APPMT

Début travaux : Fondations avant - après 01.10.81 - Installation électrique avant - après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 2x230 V Protection raccordement 40 A

Câble d'alimentation, tableau. princ. : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type diff 300mA 40A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 15 ; RA : 19 Ohm; RI tot 12 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: VOIR PLAN EN ANNEXE

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 28/09/2021 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.


L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

NON-LOU
P.T.V. LSC



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,

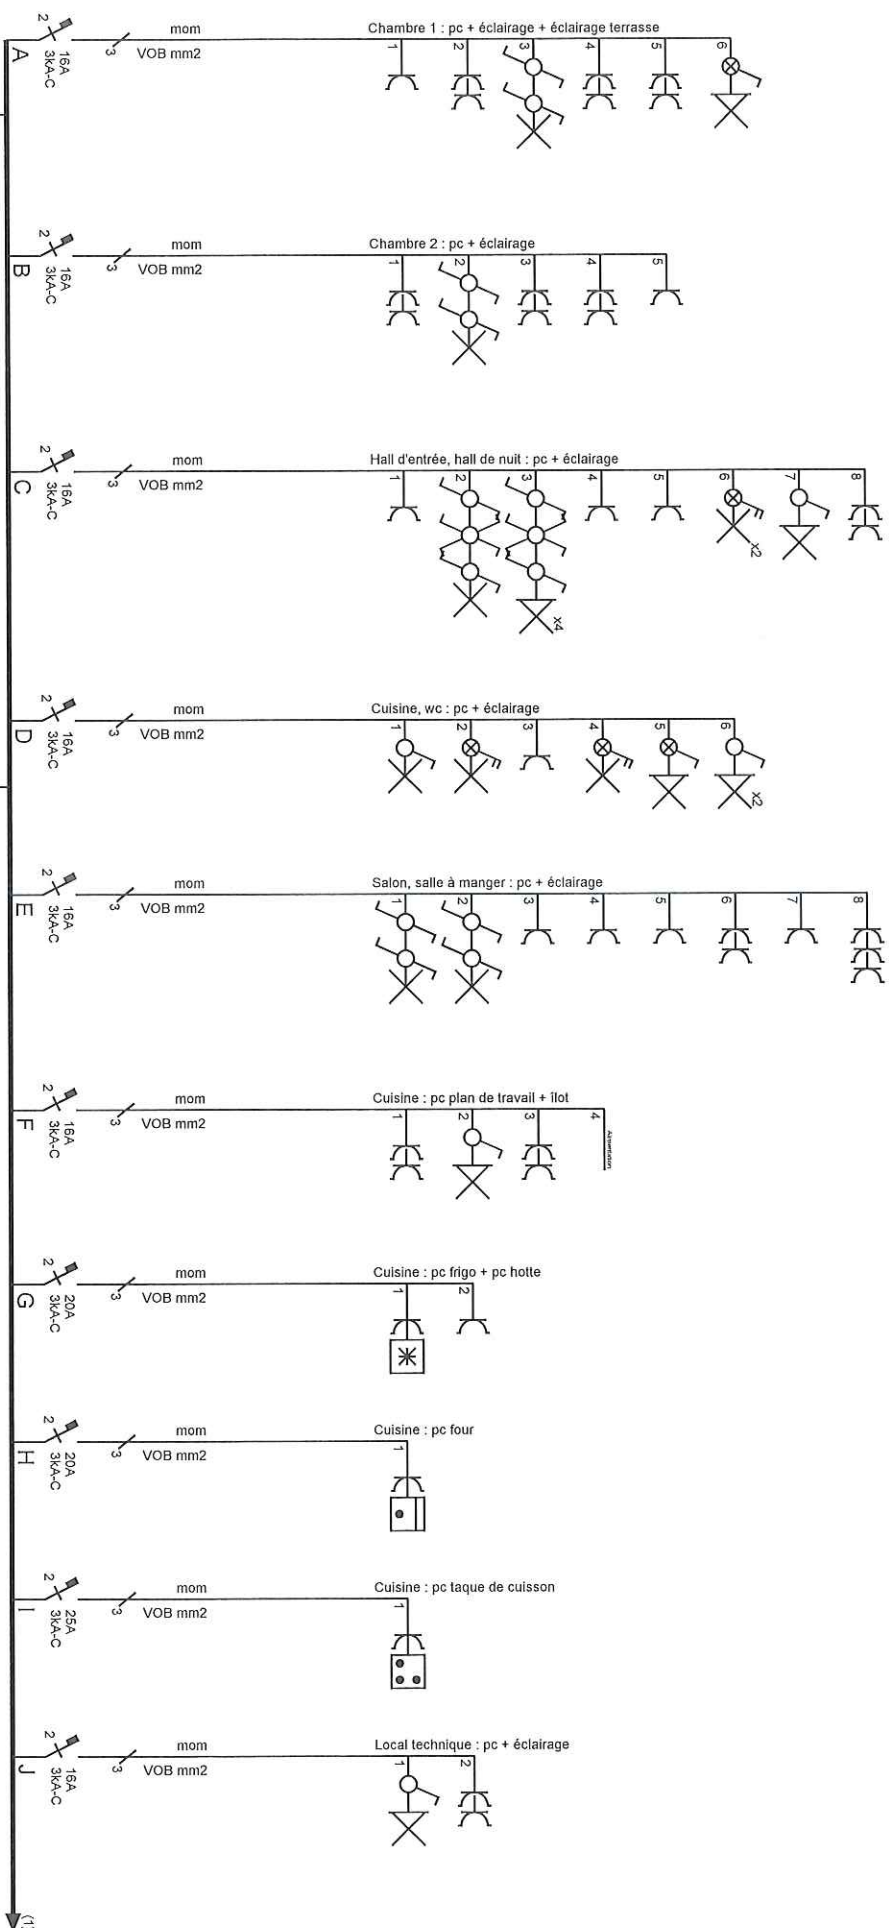

Organisme agréé

.. / .. / 2016

Propriétaire

Mme DELOOZ
Rue des Carmes 37
B-5000 NAMUR


Le responsable

09-11-16

SOLIER
ELECTRICITEELECTRICITE GENERALE
Panneaux photovoltaïques

Electricité Générale
Rue Ernest Montellier, 14/2
5380 Fernelmont

Rue Ernest Montellier 14/2
5380 Fernelmont

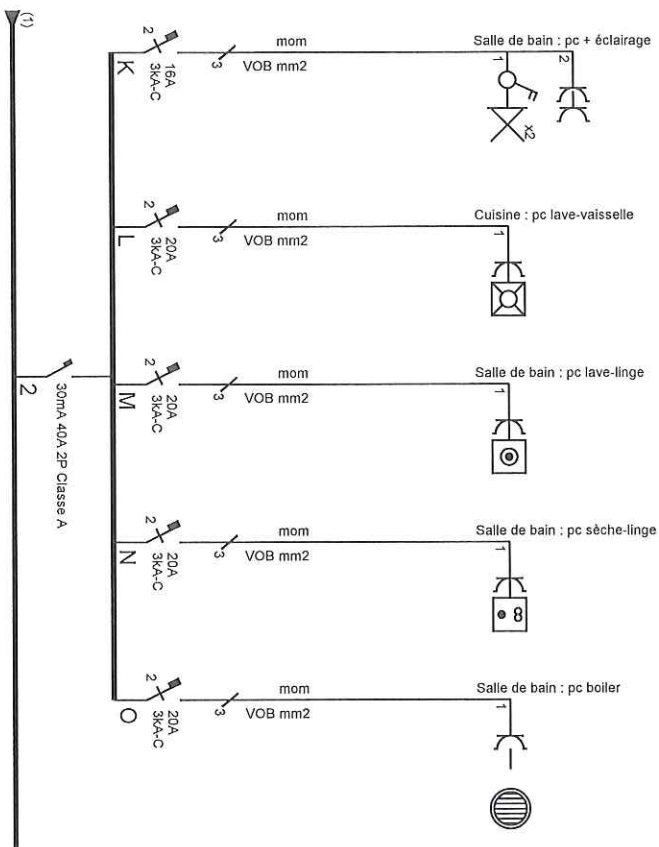

Organisme agréé

.. / .. / 2016

Propriétaire

Mme DELOOZ
Rue des Carmes 37
B-5000 NAMUR

Le responsable

09-11-16

SOLIER
ELECTRICITE



ELECTRICITE GENERALE
PAINNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Rue Ernest Montellier 14/2

5380 Fermeumont

Légende du coffret

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16A	16A	16A	16A	16A	16A	20A	20A	25A	16A	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	

o	o	o	o	o	o	o	o
16A	20A	20A	20A	20A	30mA	300mA	
					40A	40A	
o	o	o	o	o	o	o	o
K	L	M	N	O	2	1	

- A Chambre 1 : pc + éclairage + éclairage terrasse
- B Chambre 2 : pc + éclairage
- C Hall d'entrée, hall de nuit : pc + éclairage
- D Cuisine, wc : pc + éclairage
- E Salon, salle à manger : pc + éclairage
- F Cuisine : pc plan de travail + îlot
- G Cuisine : pc frigo + pc hotte
- H Cuisine : pc four
- I Cuisine : pc taque de cuisson
- J Local technique : pc + éclairage
- K Salle de bain : pc + éclairage
- L Cuisine : pc lave-vaisselle
- M Salle de bain : pc lave-linge
- N Salle de bain : pc sèche-linge
- O Salle de bain : pc boiler
- 1 Différentiel 300mA 40A
- 2 Différentiel 30mA 40A

Client		Organisme de contrôle	Installateur
Nom :	Mr et Mme CELLIER - DUPONT	Organisme : BTV	
Adresse :	Rue de Fernelmont	Nom : MOREAU	
Localité :	B-5020 CHAMPION	Date : 	
