

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221005010005 Datum onderzoek: 05/10/2022 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:
 Plaats van onderzoek: **Zagmanstraat 51, 9810 Eke (België)**
 Eig./Uitb./Beh.:
 Uitvoerder: **David Veranneman - Waalstraat 152, 9870 Zulte (België)**
 Bedrijf: **Energy@home BV** Ond nr : **BE0837841062**
 Type lokalen: **Wooneenheid**
 Doel onderzoek: **6.4 - PV-panelen - Gelijkvormigheid/indienststelling volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019**
 Installatie van: voor 1981 1981-2020 na 1-6-2020 Herkeuring op : **05/10/2047**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN:	541 448 820 068 780 294	Continuïteitsmeting:	OK
DNB:	Gaselwest	Diff. testknop:	OK
Nominale spanning:	3 x 400V + N	Diff. foutlus:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	Bescherming RA/OA:	OK
Voedingsleiding:	4 x 10 mm ² XVB	staat vast elektrisch materieel:	OK
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	12.4 MOhm
Aantal borden:	1	R aarde:	7.6 Ohm
Aantal stroombanen:	+1	Schema's:	In bijlage
Waarde diff. inr:	300mA 40A		



TOELICHTING

Dit onderzoek behelst enkel de PV-installatie.

Aantal panelen: 12 x 410 Wp

Aantal omvormers: 1

- Type: SAJ R5-4K-S2

- s/n: R5X2402J2223E54728

- Pac max: 4 kVA

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De PV-installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. Het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 05/10/2047 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221005010005 Datum onderzoek: 05/10/2022 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek. Bij onbereikbaarheid van de metalen structuur zonnepanelen kan bijkomende equipotentiale verbinding niet worden gemeten. (7.112.2)

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 05/10/2022




Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221005010005 Datum onderzoek: 05/10/2022 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

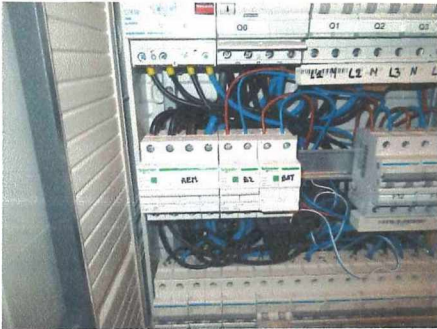

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221005010005 Datum onderzoek: 05/10/2022 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

