ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 22/10/2026 **Inspecteur:** Jonas Van Assche **Mentor:** **Installateur:** Bestaande installatie
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0800 247 228

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 23160673

Datum verslag: 22/10/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Stuivenbergstraat
Huisnummer	56
Busnummer	
Postcode	8870
Gemeente	IZEGEM
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Stuivenbergstraat
Huisnummer	56
Busnummer	
Postcode	8870
Gemeente	IZEGEM
Land	België

Installateur

Naam	Bestaande installatie
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : 1LGZ0586485454

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

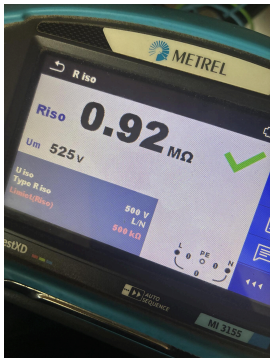
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 12

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,92 MΩ RE: 23,6 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
5	C	20		2	2,5
1	-	10		2	2,5
2	C	10		2	1,5
1	C	6		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

N23 Alle differentieelstroombeschermingsrinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O; Niet alle stopcontacten waren toegankelijk en konden hierdoor niet allemaal getest worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat er bij een toekomstige inspectie hier bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 22/10/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:59 tot 12:53

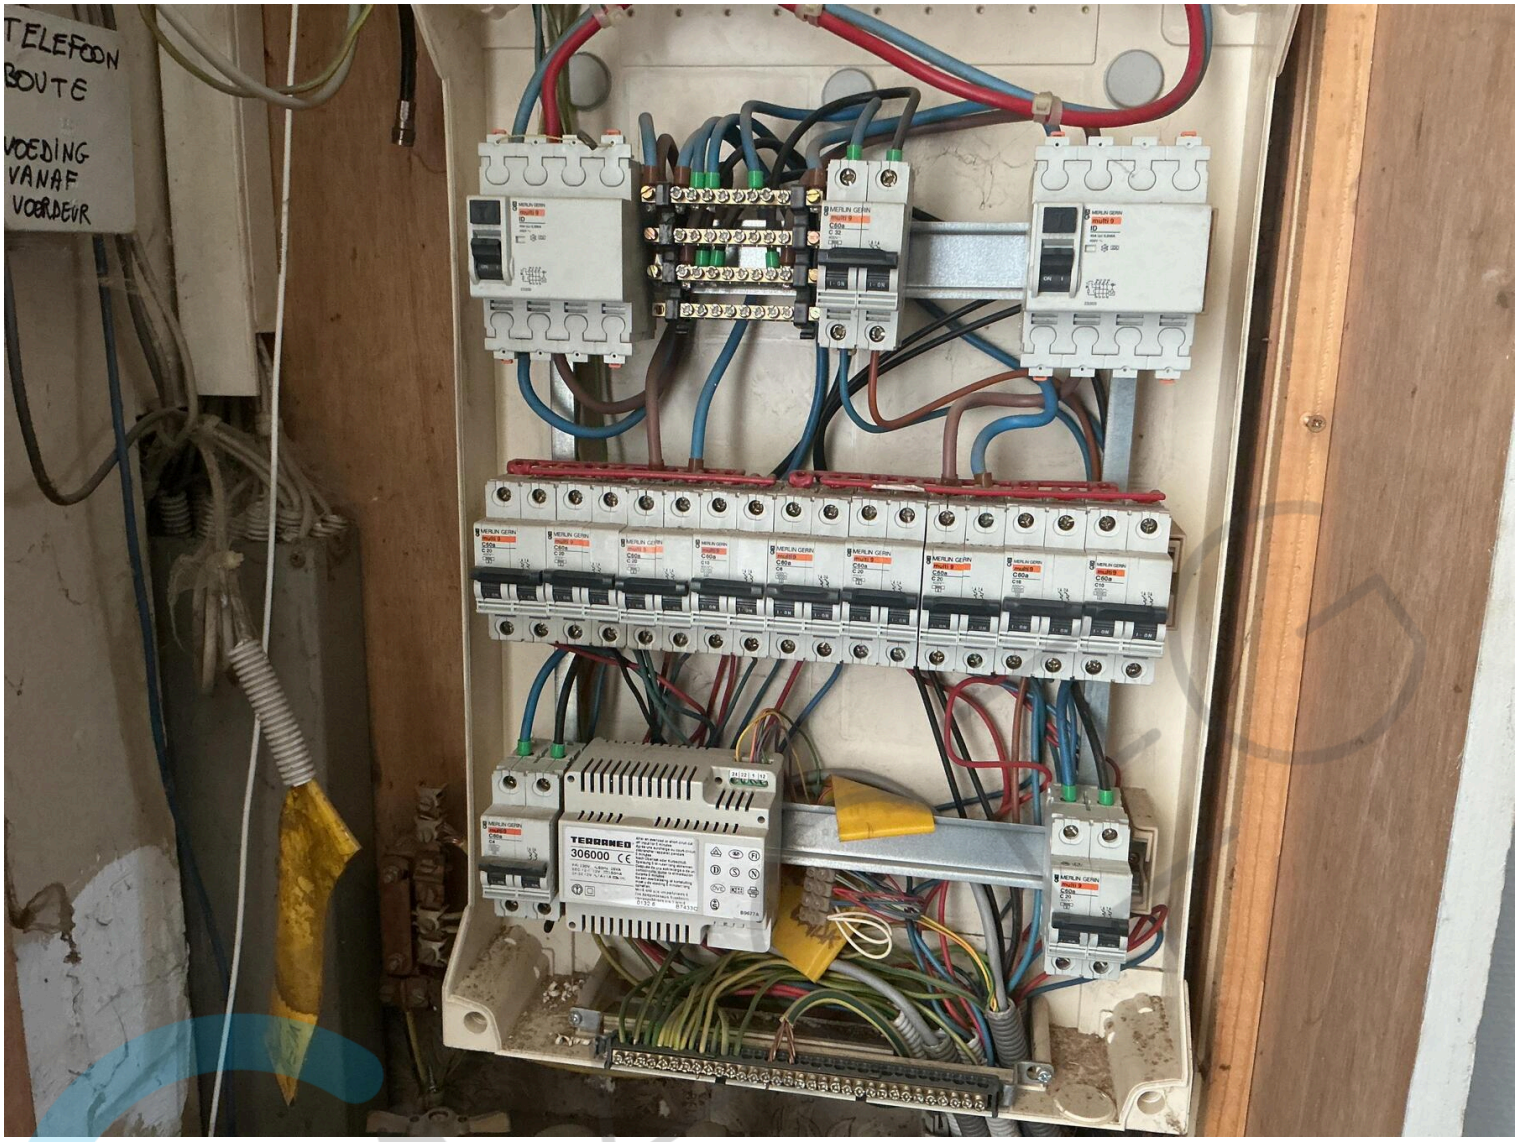
De inspecteur Jonas Van Assche

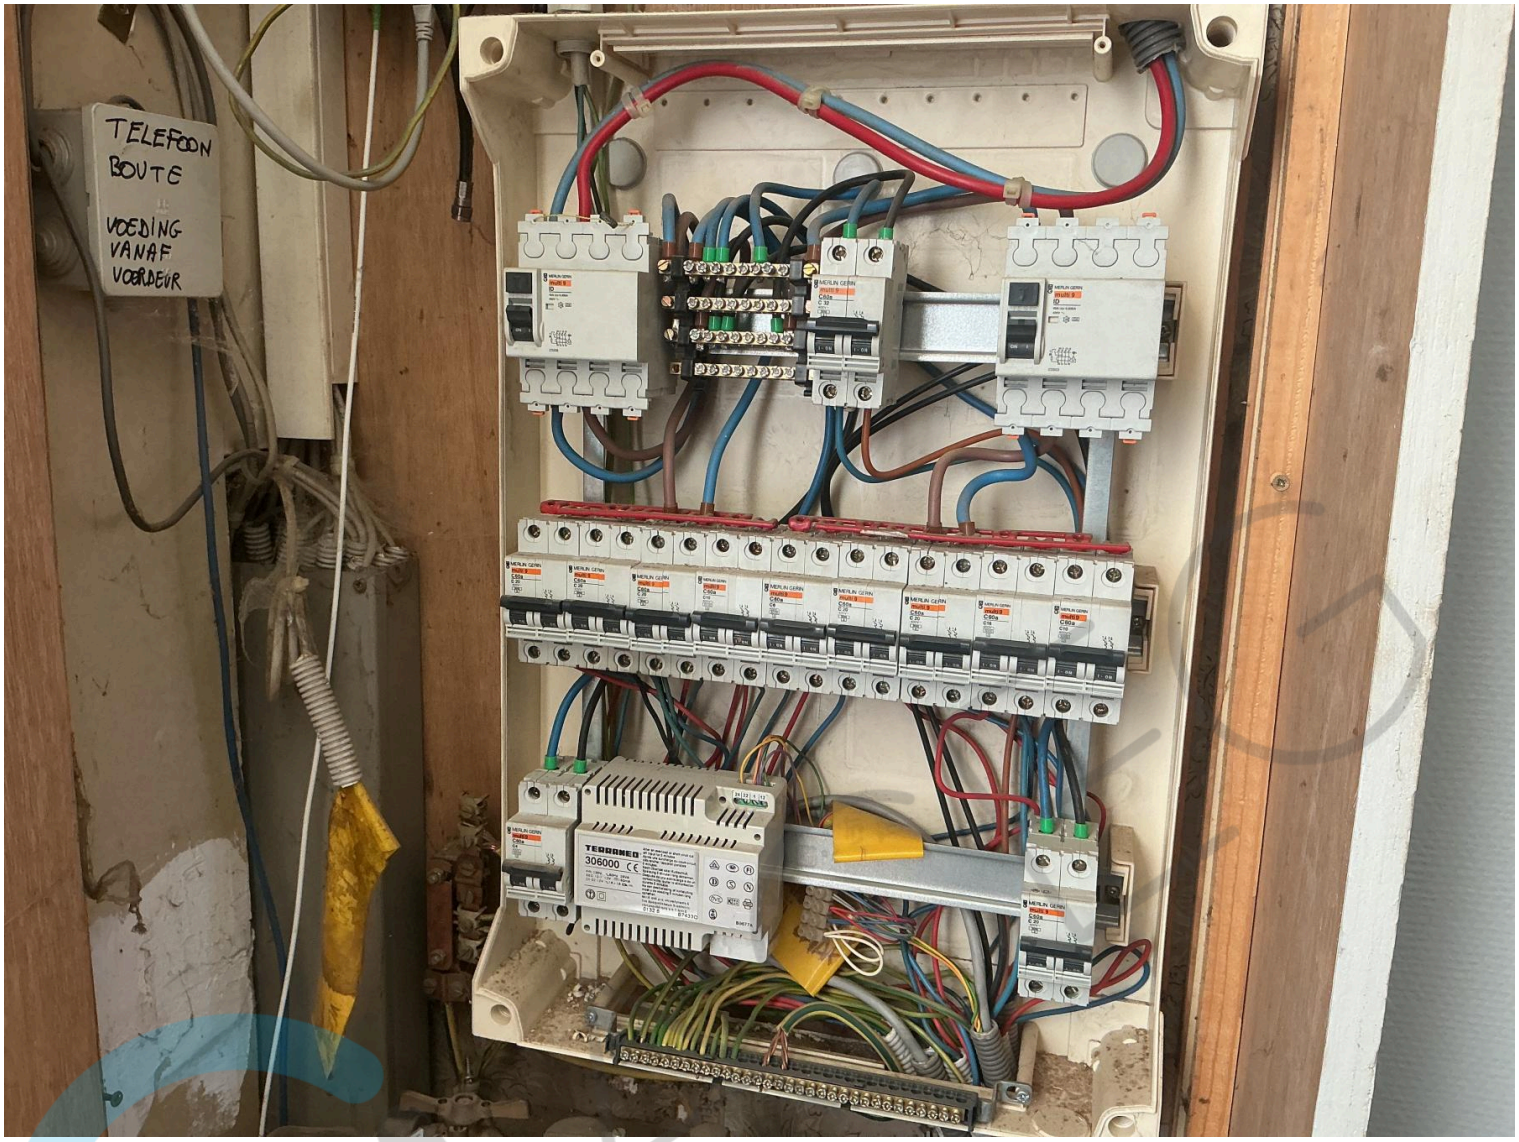


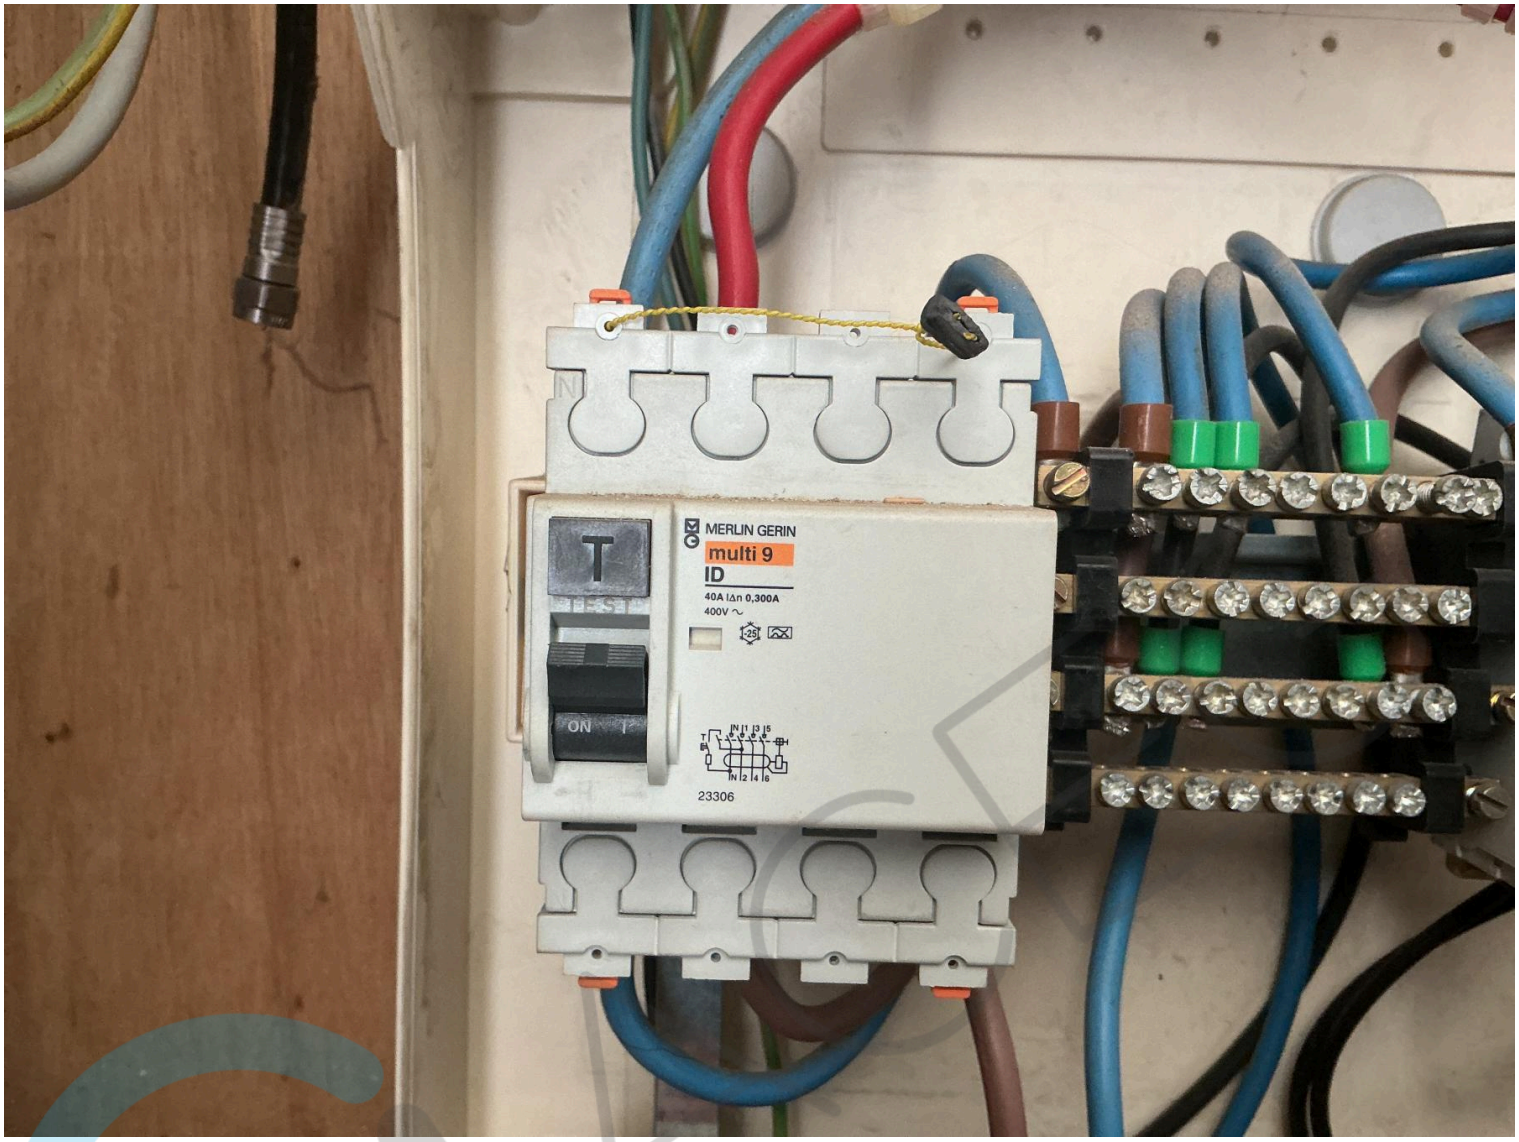
Jonas Van Assche
ACEG VZW - 0327

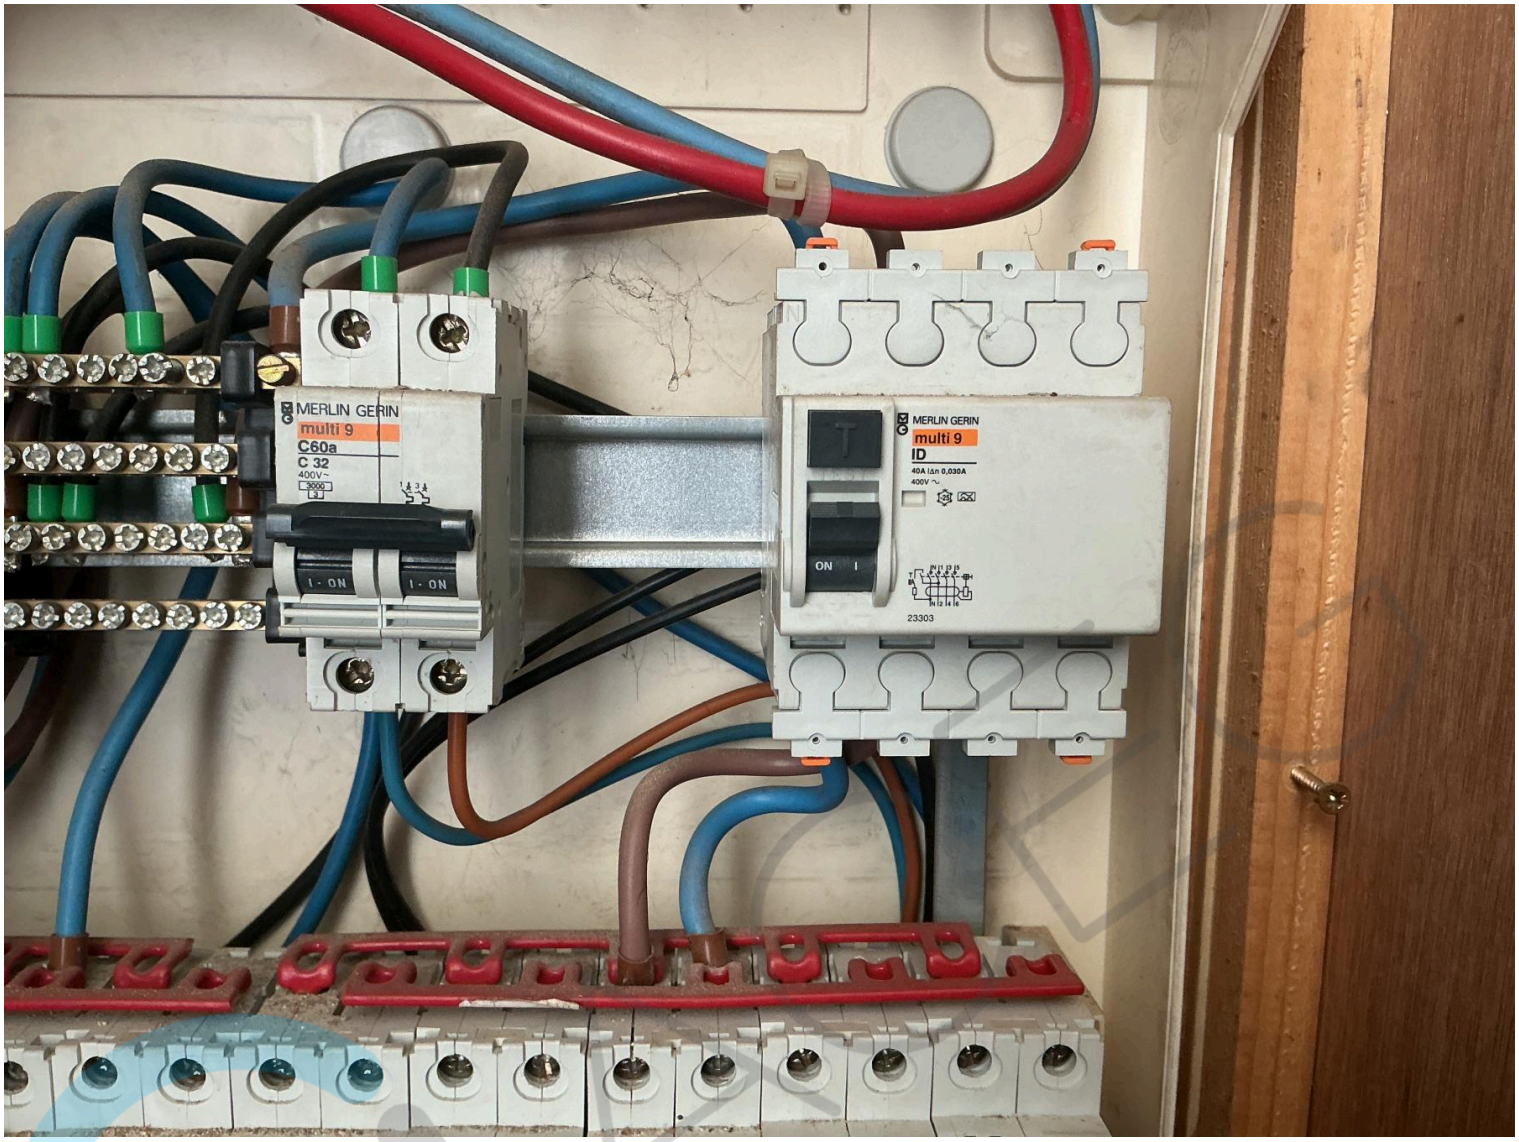
Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

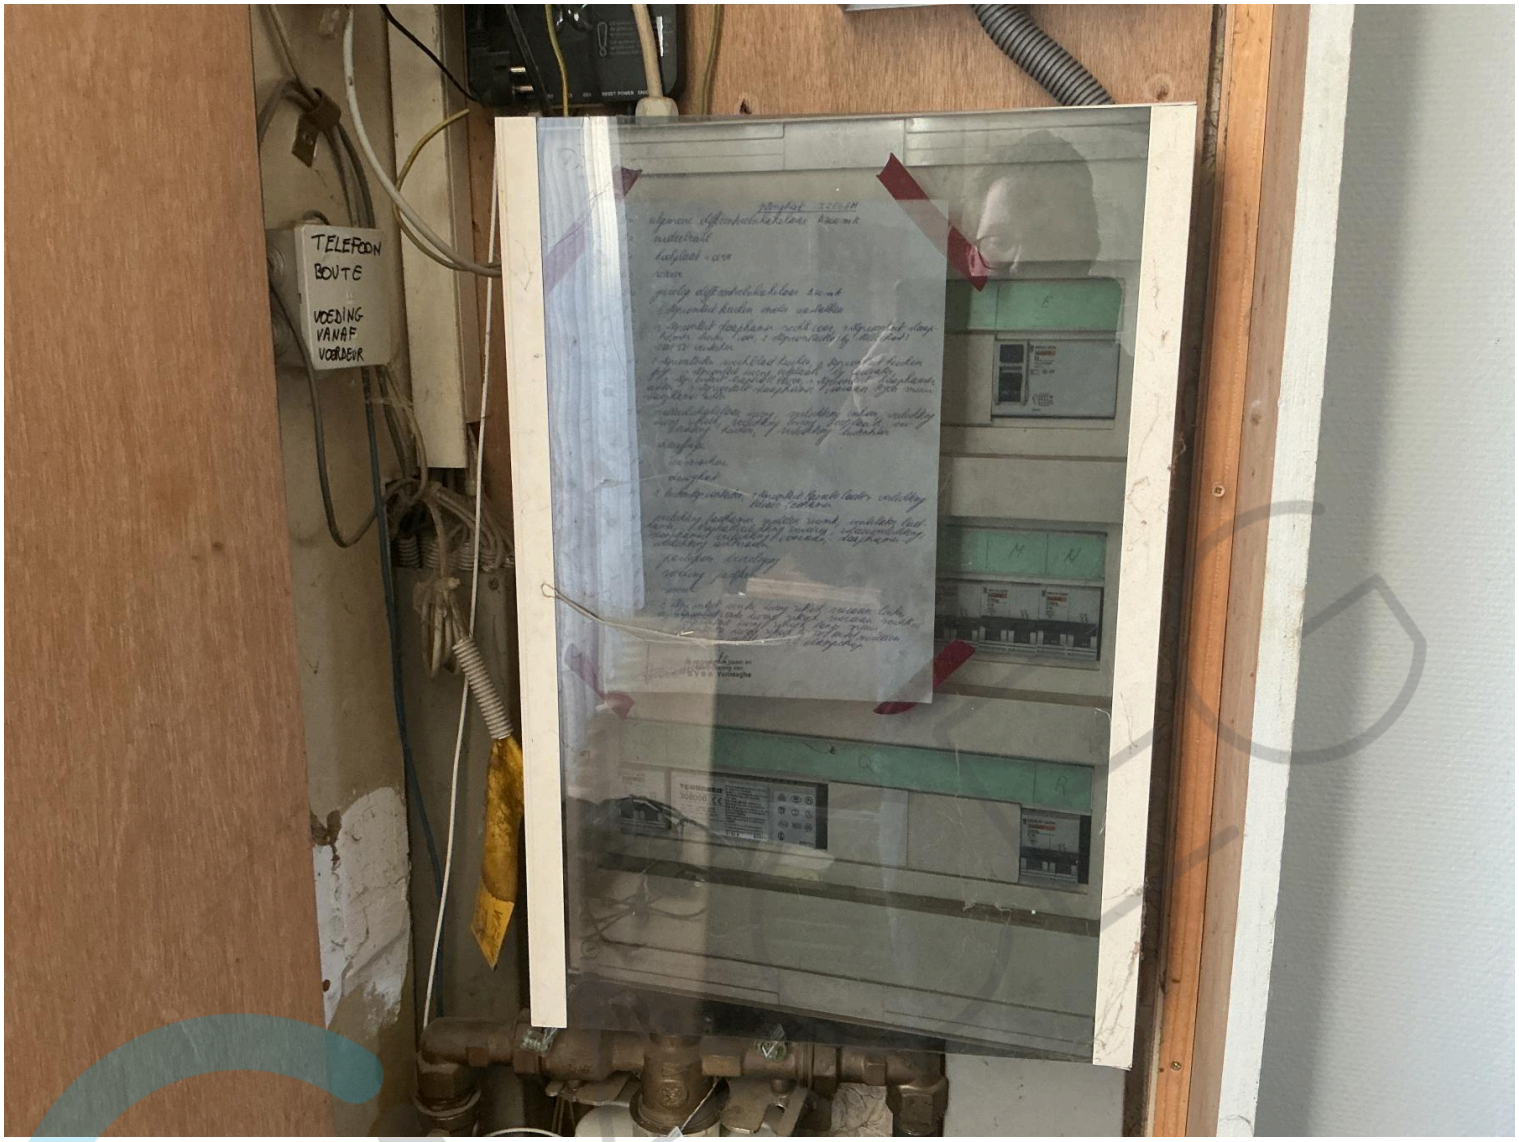
Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.


TELEFOON
BOUTE
VOEDING
VANAF
VOORDEUR
TERRANEO
306000


TELEFOON
BOUTE
VOEDING
VANAF
VOORDEUR
TERRAMED
306000


T
TEST
ON
MERLIN GERIN
multi 9
ID
40A IΔn 0,300A
400V ~
23306


MERLIN GERIN
multi 9
C60a
C 32
400V~
1 - ON
1 - ON
MERLIN GERIN
multi 9
ID
40A I∆n 0,030A
400V ~
ON I
23303

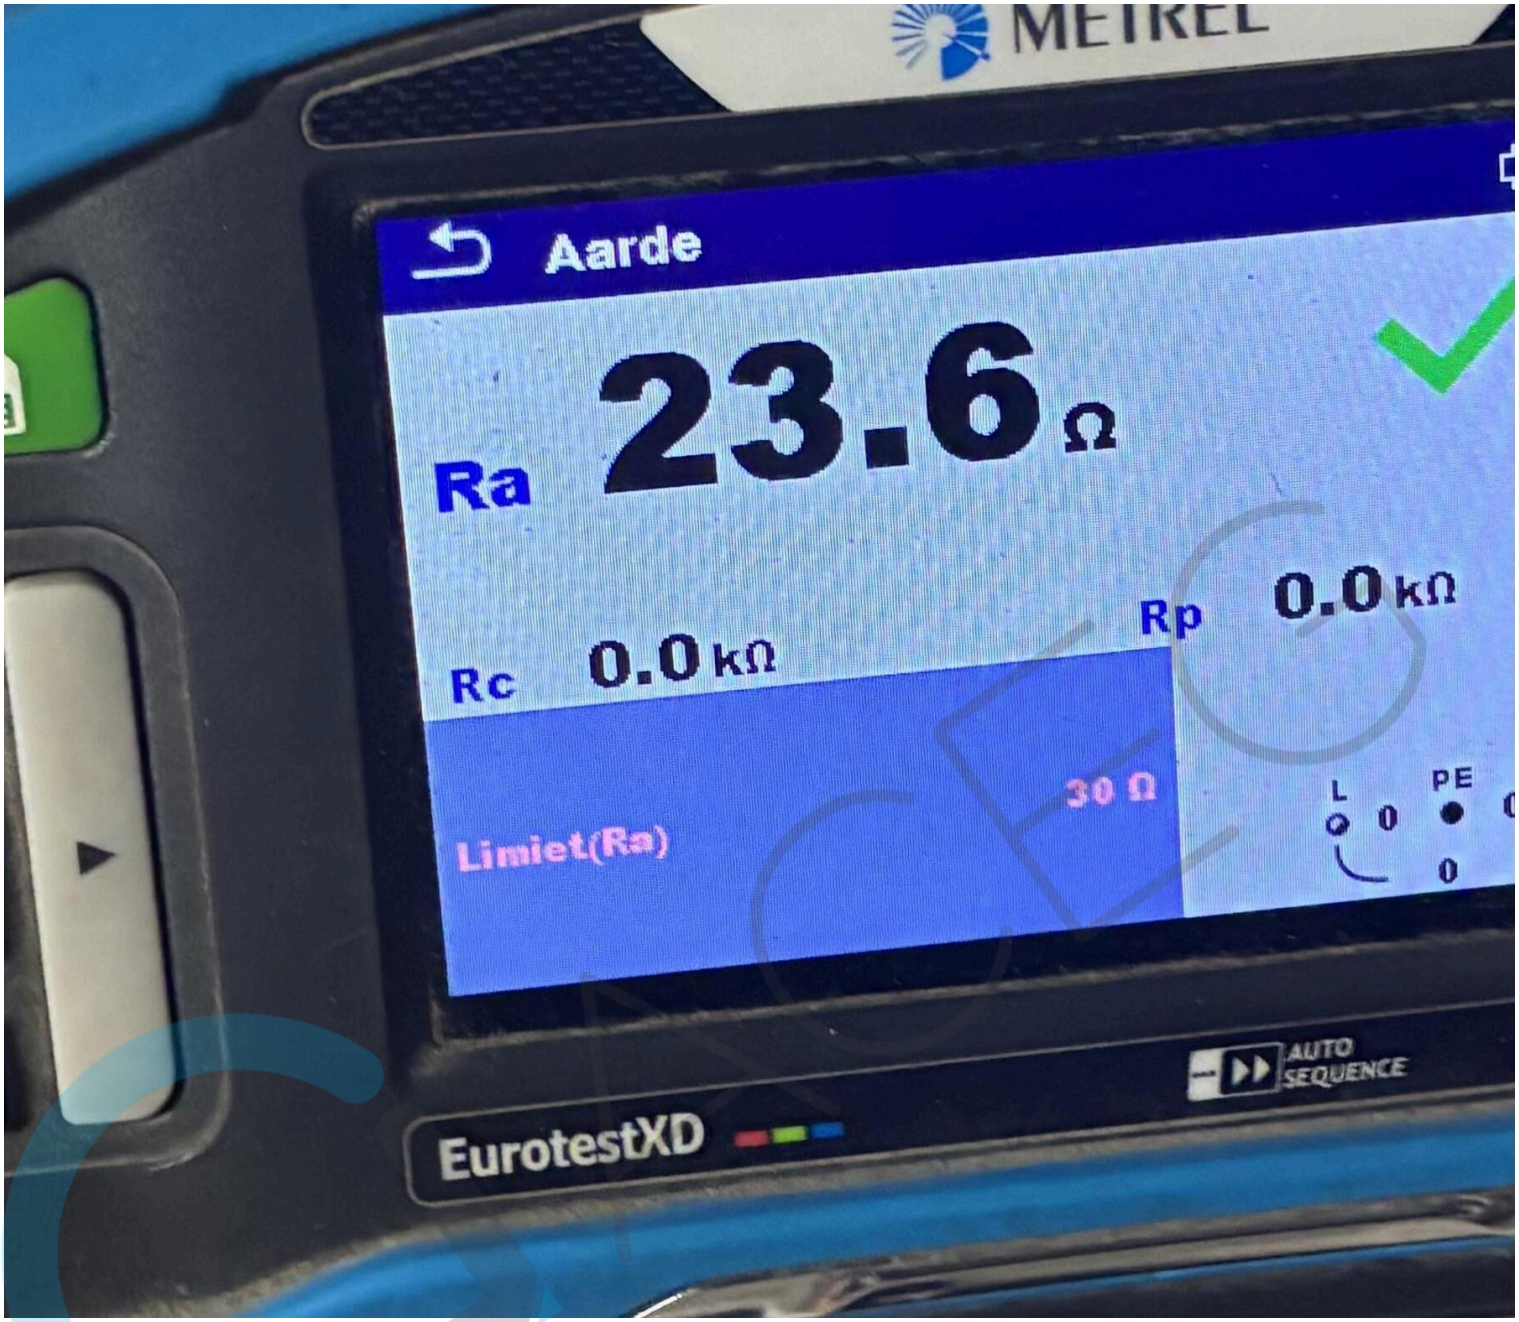

TELEFOON
BOUTE
VOEDING
VANAF
VOORDEUR






Landis+Gyr E360-3P
1000 imp/kWh CL B/kvarh CL 2
T12517
M25 1259
0,5-10(100) A 3x230/400 V & 3x230 V
50 Hz -25°C..+70°C IP54
No. 86485454 2025 UC3 6 kV Made in Greece
EN50470-1 EN50470-3 IEC62052-11 IEC62053-23
28/2025
S/N 1LGZ0586485454
HW 10
1LGZ0586485454
DLMS
M-Bus


fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN QR-CODE


METREL
Aarde
Ra 23.6 Ω
Rc 0.0 kΩ
Rp 0.0 kΩ
Limiet(Ra) 30 Ω
L
PE
AUTO SEQUENCE
EurotestXD


METREL
R iso
Riso 0.92 MΩ
Um 525 V
U iso
Type R iso
Limiet(Riso)
500 V
L/N
500 kΩ
L1
PE
N
AUTO SEQUENCE
MI 3155
